


CONCEPTVERSIE Planning World Food Centre (WFC) Ede

detailplanning

Id	%	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaand taken	Opvolgend taken	2017				2018				2019				2020												
								k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4							
1		1... World Food Center	225,8 wk...	vri 1-1-16	woe 29-4-20																											
2		2... Algemeen deel WFC / Ruimtelijke Procedures	161,8 wkn	vri 1-1-16	woe 6-2-19																											
3	0%	Stuurgroep 2017	54,2 wkn	woe 7-12-16	don 21-12-17																											
4	0%	Stuurgroep / bestuurlijk overleg	50,2 wkn	woe 7-12-16	don 23-11-17																											
5	0%	SG / Bestuurlijk Overleg	0 wkn	woe 7-12-16	woe 7-12-16																											
6	0%	SG / Bestuurlijk Overleg	0 wkn	don 9-2-17	don 9-2-17																											
7	0%	SG / Bestuurlijk Overleg	0 wkn	don 6-4-17	don 6-4-17		165																									
8	0%	SG / Bestuurlijk Overleg	0 wkn	don 15-6-17	don 15-6-17																											
9	0%	SG / Bestuurlijk Overleg	0 wkn	don 21-9-17	don 21-9-17																											
10	0%	SG / Bestuurlijk Overleg	0 wkn	don 23-11-17	don 23-11-17																											
11	0%	Stuurgroep inclusief provincie	47 wkn	don 26-1-17	don 21-12-17																											
12	0%	SG inclusief Provincie	0 wkn	don 26-1-17	don 26-1-17																											
13	0%	SG inclusief Provincie	0 wkn	don 2-3-17	don 2-3-17																											
14	0%	SG inclusief Provincie	0 wkn	don 11-5-17	don 11-5-17																											
15	0%	SG inclusief Provincie	0 wkn	don 24-8-17	don 24-8-17																											
16	0%	SG inclusief Provincie	0 wkn	don 26-10-17	don 26-10-17																											
17	0%	SG inclusief Provincie	0 wkn	don 21-12-17	don 21-12-17																											
18	48%	Stedenbouwkundig plan	65,2 wkn	vri 1-1-16	vri 31-3-17																											
25	68%	Stedenbouwkundige hoofdopzet (definitief)	22 wkn	maa 4-7-16	vri 2-12-16																											
26	75%	Verfijning stedenbouwkundige hoofdopzet	20 wkn	maa 4-7-16	vri 18-11-16 24		27;30																									
27	0%	Vaststelling door SG WFC	2 wkn	maa 21-11-16	vri 2-12-16 26		28																									
28	0%	Stedenbouwkundige hoofdopzet vastgesteld	0 wkn	vri 2-12-16	vri 2-12-16 27		32;46																									
29	0%	Stedenbouwkundig plan / Inrichtingsplan	17 wkn	maa 21-11-16	vri 17-3-17																											
30	0%	Opstellen plan van aanpak stedenbouwkundig plan / voorbereiden startsessie	2 wkn	maa 21-11-16	vri 2-12-16 26		32																									
31	0%	Schetsontwerp SP	3 wkn	maa 5-12-16	vri 23-12-16																											
32	0%	Startsessie stedenbouwkundig plan	1 dag	maa 5-12-16	maa 5-12-16 28;30		33																									
33	0%	Huiswerk, onderzoeken en toetsing bij achterban	4 dagen	din 6-12-16	vri 9-12-16 32		34																									
34	0%	Verwerken tot schetsontwerp	2 wkn	maa 12-12-16	vri 23-12-16 33		36																									
35	0%	Voorlopig SP	7 wkn	maa 26-12-16	vri 10-2-17																											
36	0%	Vervolgssessie SP	1 wk	maa 26-12-16	vri 30-12-16 34		37;38																									
37	0%	Verwerken tot voorlopig stedenbouwkundig plan	3 wkn	maa 2-1-17	vri 20-1-17 36		39																									
38	0%	Opstellen matenplan	3 wkn	maa 2-1-17	vri 20-1-17 36		39																									
39	0%	Huiswerk, onderzoeken en toetsing bij achterban	2 wkn	maa 23-1-17	vri 3-2-17 37;38		40																									
40	0%	Opstellen toelichting	1 wk	maa 6-2-17	vri 10-2-17 39		42																									
41	0%	Definitief SP	5 wkn	maa 13-2-17	vri 17-3-17																											
42	0%	Finaliseringssessie SP	1 wk	maa 13-2-17	vri 17-2-17 40		43																									
43	0%	Verwerken opmerkingen/huiswerk in definitief SP	3 wkn	maa 20-2-17	vri 10-3-17 42		44																									
44	0%	Laatste check en verwerken opmerkingen in SP	1 wk	maa 13-3-17	vri 17-3-17 43		49																									
45	0%	Beeldkwaliteitsplan	15 wkn	maa 5-12-16	vri 17-3-17																											
46	0%	opstellen beeldkwaliteitsplan	15 wkn	maa 5-12-16	vri 17-3-17 28		47																									
47	0%	BKP gereed	0 wkn	vri 17-3-17	vri 17-3-17 46;160;161		101;49																									
48	0%	Vaststelling BKP / SP	2 wkn	vri 17-3-17	vri 31-3-17																											
49	0%	Definitief SP en BKP gereed	0 wkn	vri 17-3-17	vri 17-3-17 44;47		50																									
50	0%	Vaststelling door SG WFC	2 wkn	maa 20-3-17	vri 31-3-17 49		51																									
51	0%	Definitief stedenbouwkundig plan vastgesteld	0 wkn	vri 31-3-17	vri 31-3-17 50		101																									
52	26%	Milieueffectrapportage	56 wkn	maa 4-4-16	vri 28-4-17																											
62	16%	Notitie R&D	19,6 wkn	vri 2-9-16	woe 18-1-17																											
63	0%	Start notitie R&D	0 wkn	vri 2-9-16	vri 2-9-16 61BE+1 wk		64-16																									

CONCEPTVERSIE Planning World Food Centre (WFC) Ede

detailplanning

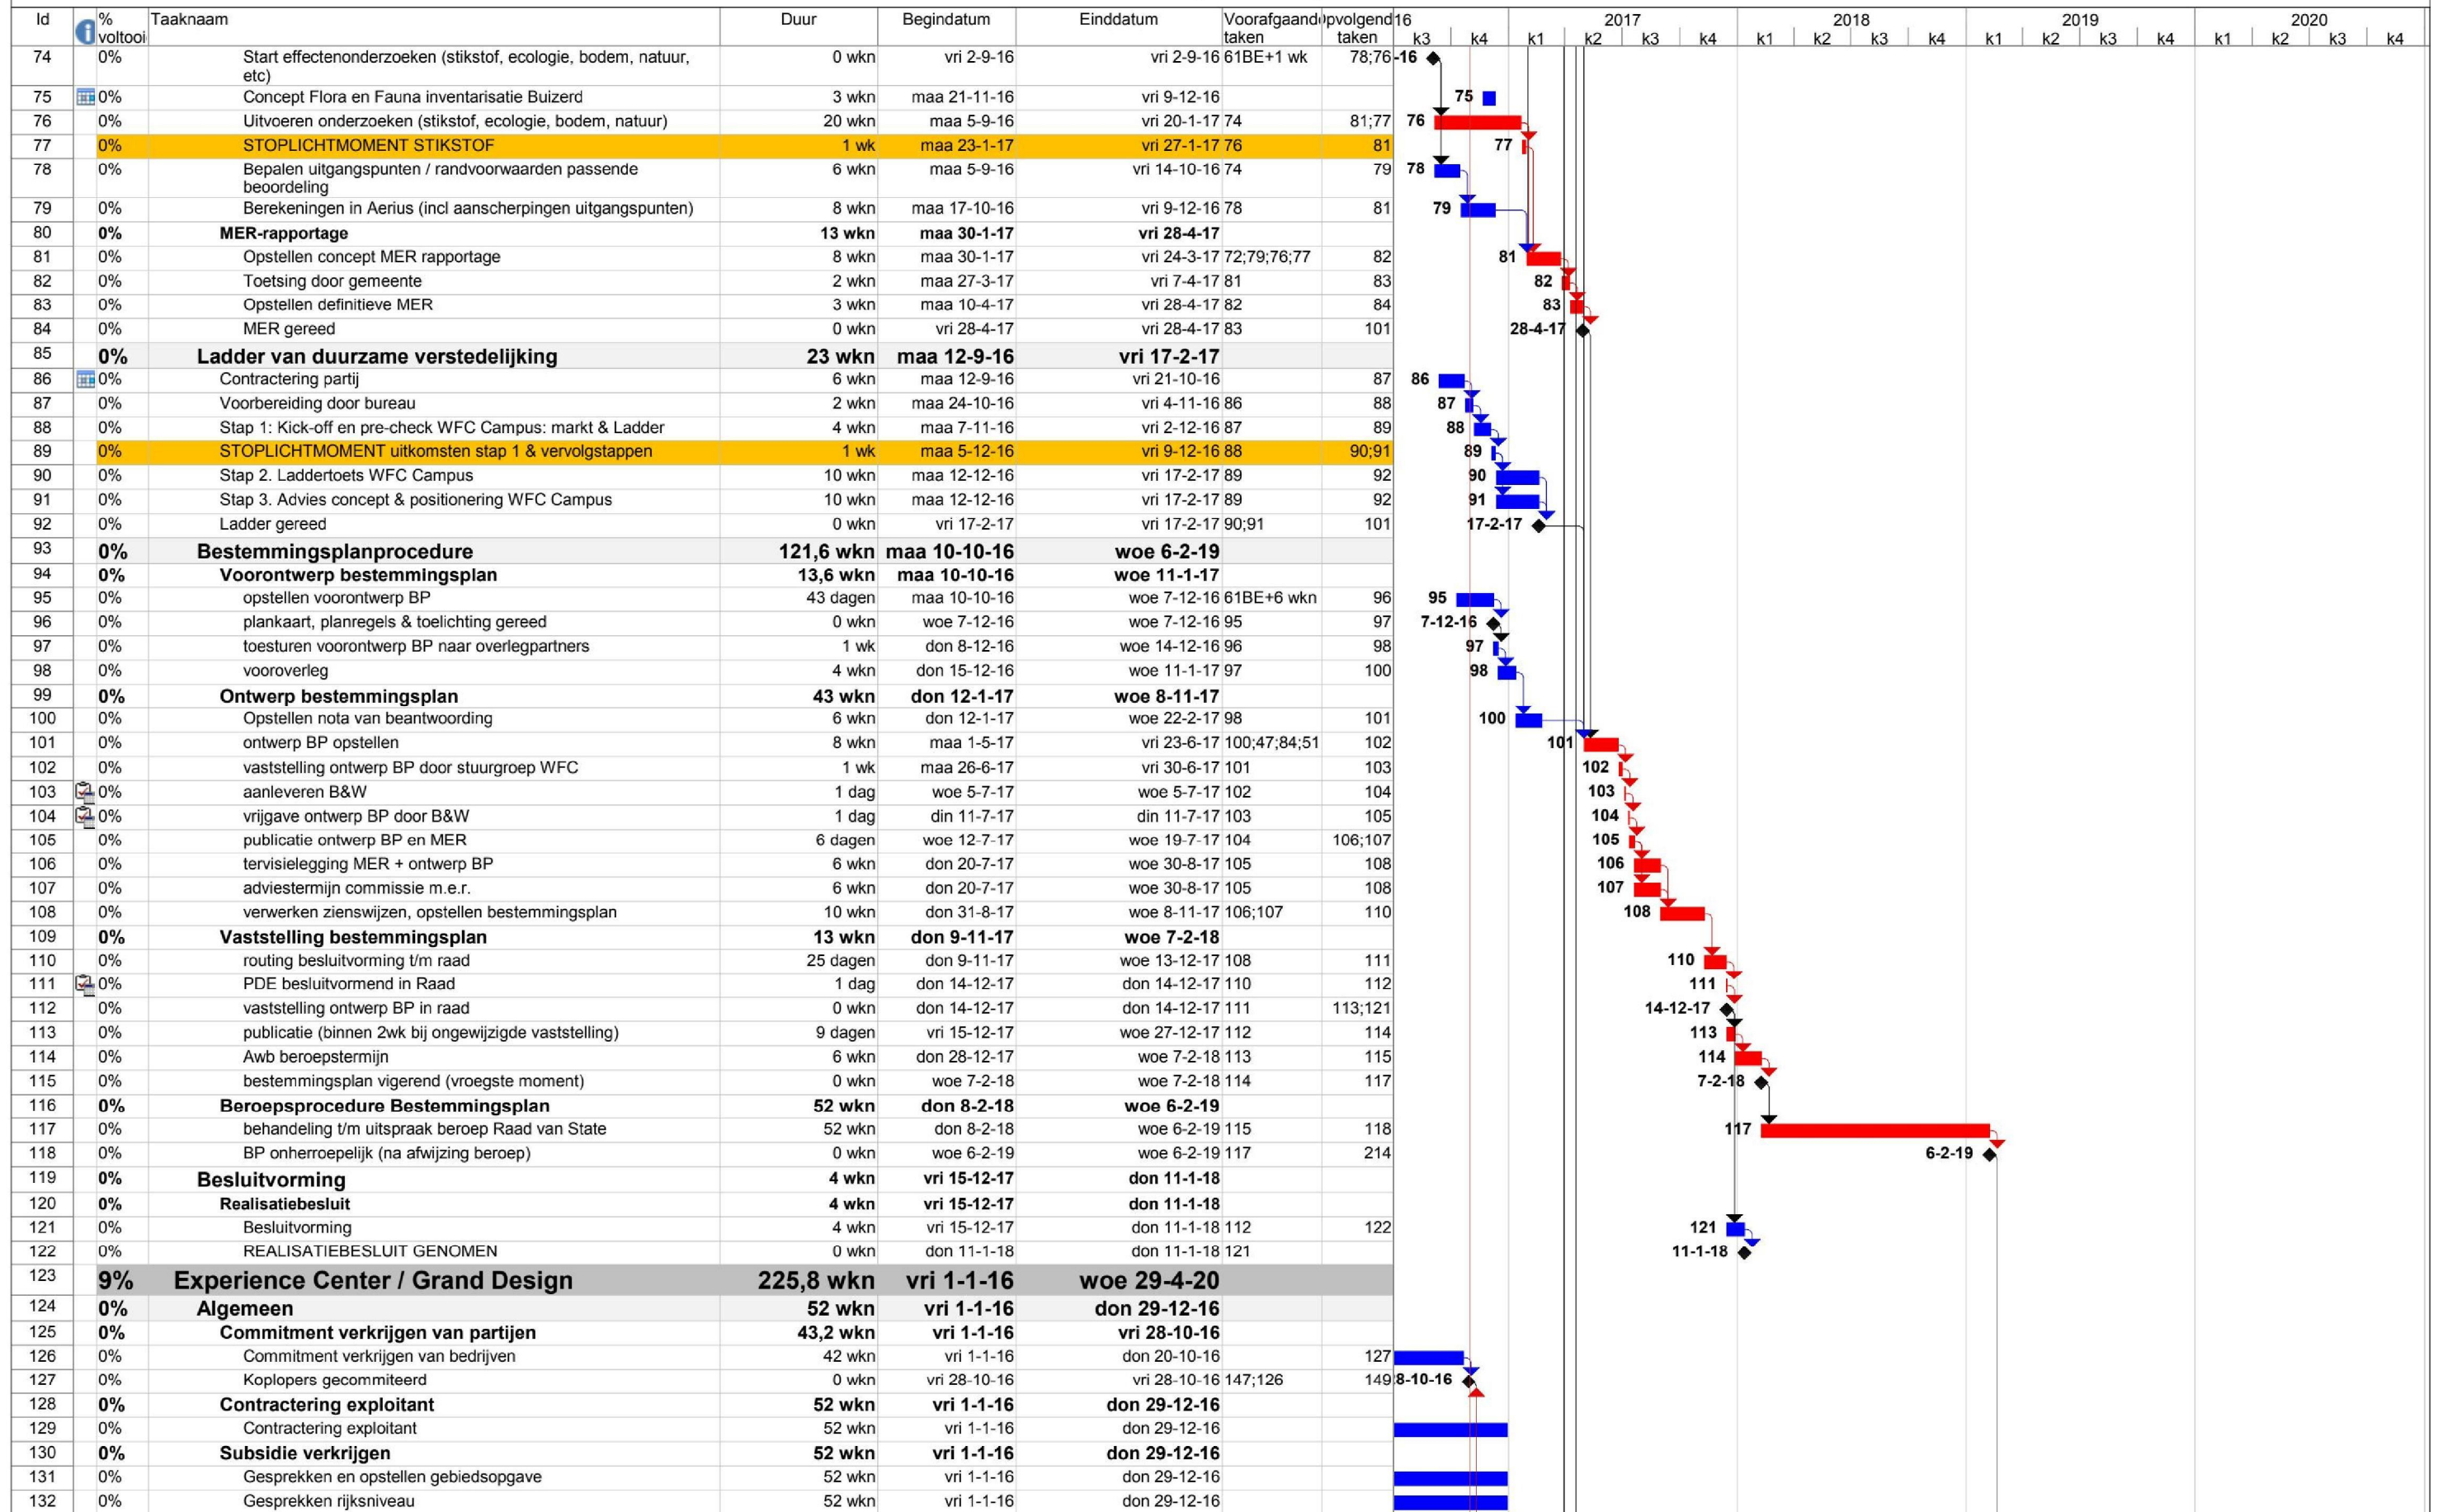

CONCEPTVERSIE Planning World Food Centre (WFC) Ede

detailplanning

Id	%	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaand taken	Opvolgend taken	2016				2017				2018				2019				2020			
								k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4		
133	0%	Onderzoek mogelijkheden overige subsidanten	52 wkn	vri 1-1-16	don 29-12-16																						
134	56%	Ontwikkelingsfase	72 wkn	vri 1-1-16	don 18-5-17																						
142	76%	Selectieprocedure uitwerking experience	25,2 wkn	vri 20-5-16	vri 11-11-16																						
146	0%	Selectie experience ontwikkelaars	1 wk	maa 3-10-16	vri 7-10-16 145	147		146																			
147	0%	Definitief commitment bedrijven	3 wkn	maa 10-10-16	vri 28-10-16 146	127;148		147																			
148	0%	Collectieve meeting koplopers / benoemen ontwikkelteam	2 wkn	maa 31-10-16	vri 11-11-16 147	149		148																			
149	0%	Definitieve gunning BRC	0 wkn	vri 11-11-16	vri 11-11-16 145;127;148	10 dagen		11-11-16																			
150	0%	Strategic & Concept Phase: Uitwerking strategisch concept ontwikkeling / Business case	16 wkn	vri 25-11-16	vri 17-3-17																						
151	0%	Concept Experience Center	16 wkn	vri 25-11-16	vri 17-3-17																						
152	0%	Start BRC experience ontwikkelaar	0 wkn	vri 25-11-16	vri 25-11-16 149BE+10 da	153		25-11-16																			
153	0%	Stap 1: Opstart en onderzoek	3 wkn	maa 28-11-16	vri 16-12-16 152	154		153																			
154	0%	Stap 2: Snelkookpansessies (Charrette)	1 wk	maa 19-12-16	vri 23-12-16 153	155		154																			
155	0%	Stap 3: Uitwerken strategisch concept (strategic planning development)	6 wkn	maa 26-12-16	vri 3-2-17 154	156		155																			
156	0%	Stap 4: Toetsing door Ede/WFCD (review and comment)	1 wk	maa 6-2-17	vri 10-2-17 155	157		156																			
157	0%	Stap 5: Verfijnen strategisch concept (refinement)	2 wkn	maa 13-2-17	vri 24-2-17 156	158		157																			
158	0%	Stap 6: Toetsing door Ede/WFCD (2nd review and comment)	1 wk	maa 27-2-17	vri 3-3-17 157	159		158																			
159	0%	Stap 7: Afwerking en oplevering product	2 wkn	maa 6-3-17	vri 17-3-17 158	160;161		159																			
160	0%	Oplevering strategisch concept + BuCa	0 wkn	vri 17-3-17	vri 17-3-17 159	164;172;47		17-3-17																			
161	0%	STOPLICHTMOMENT BRC UITWERKING EN GEVOLG VOOR SP + BKP	0 wkn	vri 17-3-17	vri 17-3-17 159	164;172;47		17-3-17																			
162	0%	Besluitvorming	8,8 wkn	maa 20-3-17	don 18-5-17																						
163	0%	Bestuurlijke besluitvorming	8,8 wkn	maa 20-3-17	don 18-5-17																						
164	0%	Besluitvorming door stuurgroep WFC	2 wkn	maa 20-3-17	vri 31-3-17 160;161	165		164																			
165	0%	Besluit stuurgroep WFC / afsluiting PPS fase 2	1 dag	don 6-4-17	don 6-4-17 164;7	166;169		165																			
166	0%	Besluitvorming college B&W	8 dagen	vri 7-4-17	din 18-4-17 165	167		166																			
167	0%	Besluit door college B&W genomen	0 wkn	din 18-4-17	din 18-4-17 166	175;168		18-4-17																			
168	0%	Besluitvorming raad	22 dagen	woe 19-4-17	don 18-5-17 167	170		168																			
169	0%	Besluitvorming PS	6 wkn	vri 7-4-17	don 18-5-17 165	170		169																			
170	0%	Besluit door raad genomen	0 wkn	don 18-5-17	don 18-5-17 168;169	181		18-5-17																			
171	0%	Besluitvorming bedrijfsleven	6 wkn	maa 20-3-17	vri 28-4-17																						
172	0%	Besluitvorming binnen deelnemende partijen	6 wkn	maa 20-3-17	vri 28-4-17 160;161	173		172																			
173	0%	Go vanuit bedrijfsleven	0 wkn	vri 28-4-17	vri 28-4-17 172	181;175		28-4-17																			
174	0%	Ondertekening masterplan	2 wkn	maa 1-5-17	vri 12-5-17																						
175	0%	Ondertekening masterplan & start ontwerpfase	2 wkn	maa 1-5-17	vri 12-5-17 167;173	176		175																			
176	0%	Masterplan ondertekend	0 wkn	vri 12-5-17	vri 12-5-17 175	181;177		12-5-17																			
177	0%	STOPLICHTMOMENT ONDERTEKENING MASTERPLAN	0 wkn	vri 12-5-17	vri 12-5-17 176	181		12-5-17																			
178	0%	Ontwerpfase	52 wkn	vri 19-5-17	don 17-5-18																						
179	0%	Bouwplanontwikkeling	52 wkn	vri 19-5-17	don 17-5-18																						
180	0%	Contractering architect	10 wkn	vri 19-5-17	don 27-7-17																						
181	0%	Aanbesteding architectenbureau	8 wkn	vri 19-5-17	don 13-7-17 173;176;177;	182		181																			
182	0%	Gunning architectenbureau	2 wkn	vri 14-7-17	don 27-7-17 181	184		182																			
183	0%	Schetsontwerp	14 wkn	don 27-7-17	don 2-11-17																						
184	0%	Start uitwerking Experience Centre	0 wkn	don 27-7-17	don 27-7-17 182	185		27-7-17																			
185	0%	Opstellen schetsontwerp	14 wkn	vri 28-7-17	don 2-11-17 184	186;187		185																			
186	0%	SO gereed	0 wkn	don 2-11-17	don 2-11-17 185	189		2-11-17																			
187	0%	ACCORDERING FASE SO	0 wkn	don 2-11-17	don 2-11-17 185	189		2-11-17																			
188	0%	Voorlopig ontwerp	14 wkn	vri 3-11-17	don 8-2-18																						
189	0%	Uitwerking schetsontwerp tot voorlopig ontwerp	14 wkn	vri 3-11-17	don 8-2-18 186;187	190;191		189																			
190	0%	VO bouwplan gereed	0 wkn	don 8-2-18	don 8-2-18 189	198;193		8-2-18																			
191	0%	ACCORDERING FASE VO	0 wkn	don 8-2-18	don 8-2-18 189	198;193		8-2-18																			
192	0%	Definitief ontwerp	14 wkn	vri 9-2-18	don 17-5-18																						
193	0%	Uitwerken voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp	14 wkn	vri 9-2-18	don 17-5-18 190;191	194;195		193																			
194	0%	DO bouwplan gereed	0 wkn	don 17-5-18	don 17-5-18 193	208		17-5-18																			
195	0%	ACCORDERING FASE DO	0 wkn	don 17-5-18	don 17-5-18 193	208		17-5-18																			
196	0%	Vorbereidingsfase	51 wkn	vri 9-2-18	don 31-1-19																						
197	0%	Inrichtingsplan	18 wkn	vri 9-2-18	don 14-6-18																						
198	0%	Opstellen VO inrichtingsplan	14 wkn	vri 9-2-18	don 17-5-18 190;191	199		198																			
199	0%	Vaststelling inrichtingsplan	4 wkn	vri 18-5-18	don 14-6-18 198	200		199																			

0000000077

0000000078


CONCEPTVERSIE Planning World Food Centre (WFC) Ede

detailplanning

din 1-11-16

Project: 20151217 werkplanning GOW
Datum: din 1-11-16
Projectplanner: [redacted]


Taak
Kritiek
Kritieke splitsing
Te laat
Voortgang
basislijn3
Mijlpaal
Mijlpaal van basislijn



Samenvatting
Samengevouwen taak
Samengevouwen mijlpaal
Samenvattingstaak van basislijn
Samengevouwen basislijn
Mijlpaal van samengevouwen basislijn
Samengevouwen voortgang
Splitsing



Splitsing in basislijn
Externe taken
Projectsamenvatting
Groeperen op samenvattingskop
Deadline
Inactieve taken
Inactieve mijlpaal
Inactieve samenvatting



Handmatig taak
Alleen duur
Handmatige samenvatting
Handmatige samenvatting
Alleen begindatum
Alleen einddatum

