

Provincie Gelderland
De 5.1.2e
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Verzenddatum: 09 DEC. 2020
Nummer: -
Uw brief van: -
Uw kenmerk: -
Onderwerp: oplevering Natura 2000
Bekendelle
Projectnummer: 80866
Contactpersoon: 5.1.2e
Telefoon: 5.1.2e
E-mail: 5.1.2e@wrij.nl
Kopie aan: auteur, RSTA, VKAI
Bijlage(n): notitie M1b, notitie M1d,
notitie M1, notitie B&O

Geachte 5.1.2e

In de afgelopen jaren heeft het Waterschap Rijn en IJssel in opdracht van de provincie Gelderland uitvoering gegeven aan de Natura 2000 maatregelen in de Bekendelle. Deze samenwerking is bekrachtigd in de uitvoeringsovereenkomst welke getekend is op 21 september 2019.

In september 2020 zijn de maatregelen afgerond. Middels dit schrijven leveren wij de werkzaamheden in de Bekendelle op. Daarbij zijn, in overleg met 5.1.2e van de provincie Gelderland de volgende aandachtspunten benoemd;

Uitvoering

De overige hydrologische herstelmaatregelen zijn uitgevoerd. Dit betreft;

- M1a aanpassen Boven Slinge is uitgevoerd.
- M1b aanleggen waterretentiegebieden Boven Slinge; Na het uitvoeren van het project Osinkbeek en Schippersbeek is de retentiedoelstelling gehaald.
- M1c verwijderen puin uit de oevers is uitgevoerd.
- Maatregel M1e; verbeteren waterkwaliteit Bekendelle. Dit project is buiten N2000 uitgevoerd.
- M2a verondiepen detailontwatering zuidelijk gebied is uitgevoerd.
- M2b aanpassen afwatering zuidoosten is uitgevoerd.
- M2d aanpassen A-watergang zuidwesten is uitgevoerd.

Vervallen maatregel

Maatregel M1d is in overleg met de provincie Gelderland niet uitgevoerd. Het betreft het herstel van de oude geul door aanpassen van de voetbrug over de Boven Slinge. Nadere analyse heeft uitgewezen dat er geen belemmerende factor is in de afvoer en dat de geul niet hersteld hoeft te worden. In de bijlage is daarvan een onderbouwing gegeven.

Graag ontvang ik uw instemming met betrekking tot de uitgevoerde en vervallen maatregelen. Conform afspraak vindt de financiële afhandeling van de werkzaamheden plaats via de SOK (Samenwerkingsovereenkomst provincie Gelderland – Waterschap Rijn en IJssel).

Bezoekadres: Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem | **Postadres:** Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
Tel.: 5.1.2e **Fax:** 5.1.2e **E-mail:** waterschap@wrij.nl | **Internet:** www.wrij.nl | **Bank:** 63.67.57.331

Swiftadres: NWABNL2G | **IBAN:** NL68 NWAB 06367573 31 | **BTW nummer:** NL 805432759B01 | **KvK** 09212548

BronDocID: WRIJPROJ284-1-3965

111220Batch635

Beheer en Onderhoud

In bijgaande notitie is het Beheer en Onderhoud voor de Bekendelle uitgewerkt.

Belangrijkste punten daarin zijn;

- Op basis van monitoring wordt de ontwikkeling van de beek en de aangrenzende bossen gevolgd. Eventuele maatregelen worden getoetst aan de Wet Natuurbescherming.
- De Boven Slinge is op het traject benedenstrooms de Klandermansweg verzand. Het waterschap heeft er in overleg met de provincie Gelderland voor gekozen om op dit moment voor dit traject geen vergunning aan te vragen voor de ontzanding van de beek.
- De provincie Gelderland sluit een financiële overeenkomst af met het waterschap Rijn en IJssel voor het beheer en onderhoud van de waterwerken in het zuidelijk deel van de Bekendelle; Het beheer en onderhoud zal op basis van deze overeenkomst belegd worden middels de keur bij het Waterschap.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Manager Waterbeheer

MEMO

Aan : [redacted] 5.1.2e (provincie
Gelderland)

Organisatieonderdeel : Waterbeheer / provincie Gelderland

Van : [redacted] 5.1.2e
Organisatieonderdeel : Waterbeheer
Datum : 3 februari 2020
Onderwerp : verbetering waterkwaliteit Bekendelle
Projectnummer : 80864

Voorstel

Het project 'Verbetering waterkwaliteit N2000-gebied Bekendelle' als onderdeel van het PAS fiche SOK 2015-2021 per 01-01-2020 te beëindigen.

Toelichting

Doel van het project

Het project 'Verbetering waterkwaliteit N2000-gebied Bekendelle' is opgenomen in de SOK 2015-2021 onder de PAS fiche als een vervolg op de waterkwaliteitspilot Winterswijk-Oeding en het project 'Gewässerkonzept'. Voor dit project is in de SOK € 75.000,- geraamd en beschikt.

Volgens het verslag van het overleg op 19-01-2016 (zie bijlage) is het doel van dit project het inrichten van een overlegstructuur samen met de Duitse partners en te komen tot concrete vervolgstappen en een programma met uit te voeren projecten die met de inzet van andere financiële instrumenten (b.v. POP / DAW) uitgevoerd kunnen worden. Daarbij te denken aan het plaatsen van een vuilvang bij de grens om Duits vuil af te vangen of na te gaan de het te hoge gehalte aan stikstof nutriënten af te vangen.

Dit project gericht op de verbetering van de waterkwaliteit is in aanvulling op het project 'PAS Bekendelle, Hydrologisch herstel, mitigatie en natschade' (project 808660) gestart.

Aanpak

De gewenste aanpak om te komen tot een betere waterkwaliteit is bij aanvang van het project verkend met de verschillende partners (provincie Gelderland, Kreis Borken, Landwirtschaftskammer Borken, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek, Duitse agrariërs (landwirtschaftliches Ortsverbände). Deze aanpak is verwerkt in een Projectomschrijving die in overleg met de provincie Gelderland door WRIJ is vastgesteld (zie bijlage).

Er is gekozen voor een kortdurend uitwisselingsprogramma om mogelijkheden voor nieuwe projecten om nutriënten terug te dringen op het spoor te komen. Centraal staat daarbij een (hernieuwde) uitwisseling van actuele kennis van en ervaring met het terugdringen van af- en uitspoeling van meststoffen en een langdurig goed agrarisch rendement door een goede bodemstructuur en een efficiënte benutting van meststoffen.

Project voortgang

Sinds 2016 is er gewerkt aan het opzetten van een netwerk van betrokken Duitse en Nederlandse agrariërs uit het stroomgebied en verschillende actoren (WRIJ, provincie Gelderland, gemeente Südlohn, Landwirtschaftskammer, Kreis Borken, bezirksregiering Münster).

In het kader van dit project hebben er 7 overleggen met een projectgroep plaatsgehad en 2 informatiebijeenkomsten inclusief demonstraties in het veld. Bij een eerste bijeenkomst (incl. demonstratie) over emissiearme verspreiding en efficiënte benutting van drijfmest en bodemverdichting waren circa 25 personen uit NL en 15 uit Duitsland aanwezig. Een tweede bijeenkomst vond in Duitsland plaats en ging over de teelt van mais en graan met aandacht voor een duurzame bodem. In eerste instantie waren alleen personen vanuit het LTO-bestuur en de organiserende instanties aanwezig, die later aansloten bij een jaarlijks georganiseerde demonstratie van een proefboerderij waar 60-80 Duitse agrariërs aanwezig waren.

Ondanks deze geslaagde bijeenkomsten is er vanuit LTO Noord afdeling Oost Achterhoek en vanuit de LWK geen interesse voor een vervolg van het uitwisselingsprogramma. Dit komt ten eerste voort uit een verschil van inzicht over de hoogte van de concentratie van meststoffen in het oppervlaktewater en ten tweede over de bijdrage aan deze concentraties vanuit de landbouw. Vanaf de start is de twijfel over de invloed vanuit de agrarische sector geuit, evenals de twijfel over de haalbaarheid van de waterkwaliteitsnormen. Vanaf november 2018 is deze twijfel een centraal onderwerp in de discussie geworden.

Ten tweede wordt vanuit de betrokken agrarische organisaties gemeld dat er geen animo is voor een uitwisselingsprogramma en voorlichting omdat veel agrariërs momenteel alleen met 'overleven' bezig zijn en omdat er vanuit de sector zelf een (over)aanbod is aan voorlichtingsbijeenkomsten.

Tot slot is geen animo omdat de kosten voor maatregelen ten behoeve van verbetering van de waterkwaliteit niet worden vergoed en subsidieaanvragen bijzonder veel tijd en inzet kosten met onzeker resultaat.

Op de kritiek vanuit de agrarische betrokkenen is geanticipeerd door eerst meer in te zoomen op het in beeld brengen van de bronnen van fosfaat en stikstof aan weerszijden van de grens aan de hand van meetresultaten. Hiervoor is draagvlak aanwezig onder de betrokken partijen.

Het doel is om daarna met de belangrijkste bronnen in gesprek te gaan over maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Ten aanzien van de afvang van zwerfvuil in de Boven-Slinge is regelmatig overleg geweest met de gemeente Südlohn. Medewerkers vanuit de gemeente waren in eerste instantie van mening dat het vuil voldoende wordt verwijderd bij de stuw in Südlohn. Na aandringen is toch gekeken naar de mogelijkheden voor het aanbrengen van een vuilvang. Door een leverancier van vuilvangen is geconstateerd dat het plaatsen van een vuilvang niet goed uitvoerbaar zou zijn. Dit is voor de gemeente Südlohn de reden geweest van het plaatsen van een vuilvang af te zien.

Afronding project

Wij constateren dat het project 'Verbetering waterkwaliteit N2000-gebied Bekendelle' niet op korte termijn zal leiden tot (het definiëren van) concrete maatregelen die de waterkwaliteit zullen verbeteren en dat dit voorlopig niet zal veranderen. Per 1 januari 2020 is dit project dat binnen de SOK plaats vond daarom beëindigd. WRIJ blijft via andere sporen haar beleid gericht op een verbetering van de waterkwaliteit uitvoeren.

Financiële verantwoording

Aan het project 'Verbetering waterkwaliteit N2000-gebied Bekendelle' is in totaal tot en met 31-12-2019 een bedrag van circa € 22.000 besteed.

Verkregen inzichten

Uit het proces tot nu toe zijn inzichten opgedaan die van pas kunnen komen bij vergelijkbare processen in de toekomst. Het betreft de volgende inzichten:

1. We constateren dat het in een tijd dat de agrarische sector onder druk staat, moeilijk is om aandacht te krijgen voor thema's die niet (direct) leiden tot verhoging van het rendement van de agrarische bedrijfsvoering. Een sectorale aanpak gericht op verbetering waterkwaliteit is wellicht minder effectief dan een integrale aanpak die meerdere doelen dient.
2. Door een te brede benadering (alle agrariërs in het stroomgebied), voelt de individuele agrariër zich niet direct aangesproken. Een meer specifiekere/individuele benadering op basis van een inschatting van de impact van percelen/erven op de waterkwaliteit vanwege hun ligging, is waarschijnlijk effectiever.
3. Door een verandering in de personele bezetting binnen de Landwirtschaftskammer heeft de projectorganisatie te veel een Nederlands karakter gekregen. Er mist een Duitse overheid die met gezag leiding geeft aan het proces om te komen tot een betere waterkwaliteit.

Bijlage brief oplevering werken Natura 2000 aan provincie; Toelichting Beheer en Onderhoud

Boven Slinge traject Molenkolk – Klandermansweg

De Boven Slinge is op het traject van de Molenkolk tot de Klandermansweg ontzand (M1a) en het puin is uit de oevers gehaald (M1c). Er is meer puin uit de beek en de beekbodem verwijderd dan op basis van de metingen is ingeschat. De maatregelen hebben een groter effect (circa 15 cm verlaging van de waterstand) dan vooraf berekend was (circa 10 cm verlaging).

Deze verlaging constateren we op de gemeten waterstanden op 25-11-20; De WS boven=32,34+, de WS beneden is 30,16+, Klepstand 32,24, $Q=0,23\text{m}^3/\text{s}$. Op 10-11-19 was de WS boven, Klepstand en Q identiek en de WS beneden 30,31.

De verlaging van het waterpeil heeft naar verwachting ook een groter effect op de alluviale bossen dan vooraf is berekend. Het Waterschap en de provincie Gelderland hebben daarom afgesproken de beekbodem met rust te laten zodat de situatie zich weer kan herstellen.

Het beheer en onderhoud van de watergang en oevers is middels de keur belegd bij het Waterschap. Voor het beheer en onderhoud van de watergangen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd;

- De beek en de oevers zijn kwetsbaar en worden zo veel mogelijk met rust gelaten.
- In ieder geval tot het voorjaar van 2021 worden er geen maatregelen genomen in de Molenkolk en de beek; in het voorjaar van 2021 wordt tijdens een veldbezoek met provincie en waterschap bekeken en besproken hoe de Boven Slinge en de andere watergangen in de Bekendelle ecologisch functioneren, op zichzelf en in relatie tot de omliggende habitattypen.
- Indien werkzaamheden voor beheer en onderhoud op het traject in de Bekendelle leiden tot significante effecten op de Natura 2000 habitats is een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming vereist.
- Monitoring van de ontwikkeling van de alluviale bos wordt jaarlijks uitgevoerd in het kader van de jaarlijkse Natura 2000 veldbezoeken (initiatief provincie Gelderland). Op basis van de bevindingen in dit veldbezoek en op advies van de betrokken specialisten van provincie en waterschap wordt bepaald of ingrijpen nodig is en hoe een eventuele ingreep plaatsvindt. Daarbij wordt getoetst op de ecologische waarde van de beek, het hydrologisch systeem en de ecologische situatie van de aangrenzende bossen. Met een inmeting (initiatief Waterschap) van de beek wordt in beeld gebracht hoe de beek zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de situatie na de ingreep.

Boven Slinge; locatie Molenkolk

Door het regelmatig opschonen van de Molenkolk voorkomen we verdere aanzanding van de beek. Omdat aanzanding van de Boven Slinge ten opzichte van de huidige situatie (direct na uitvoering van de maatregelen M1a en M1c, zomer 2020) voor het behoud en de ontwikkeling van het alluviale bos wel gewenst is, is afgesproken dat in ieder geval tot het voorjaar 2021 geen ontzanding van de Molenkolk plaatsvindt. Daarna is een ecologische toetsing zoals genoemd bij het traject Molenkolk-Klandermansweg nodig om te bepalen of ontzanding mogelijk is. Het baggeren van de Molenkolk wordt mogelijk als uit een ecologische toetsing blijkt dat er een situatie is bereikt waarbij de beek een ecologisch wenselijk profiel heeft ontwikkeld (en daarmee indirect de hydrologisch gewenste situatie voor de alluviale bossen is ontstaan).

Het opschonen van de Molenkolk heeft geen waterstand verlagend effect benedenstrooms. Omdat er geen sprake is van een significant negatief effect op de Natura 2000 habitats is het opschonen van de Molenkolk niet vergunningplichtig in het kader van de Wnb. Het is daarom ook niet nodig dit op te nemen in het beheerplan Natura 2000. Werkzaamheden aan de Molenkolk moeten, ook in de toekomst, getoetst worden op eventuele effecten benedenstroom en een mogelijk significant effect op de aangewezen alluviale bossen benedenstrooms, om een vergunningaanvraag uit te sluiten.

Boven Slinge traject Klandermansweg – houten brug

Ten tijde van het opstellen van het beheerplan Natura 2000 was alleen het eerste deel van de Boven Slinge verzand (2009). De ontzanding daarvan is vanuit de GGOR als maatregel in het beheerplan opgenomen. Nu is ook het deel benedenstrooms van de Klandermansweg verzand. Een waterpeilverlaging die tegemoetkomt aan de ontwerphoogte van de watermolen zou alleen mogelijk kunnen zijn door verdere ontzanding van de beek benedenstrooms.

De ontzanding van het 2e traject is geen onderdeel van het Natura 2000 beheerplan. In de Passende Beoordeling (Arcadis juli 2019) zijn de effecten op de Natura 2000 Habitats van het gebied bij de ontzanding van het 2e traject in beeld gebracht. De conclusie van deze beoordeling is dat er bij ontzanding van dit traject sprake is van een verlaging van de grondwaterstand in de directe omgeving. Daarmee is er een significant negatief effect op de aanwezige natuurwaarden. Het waterschap heeft er daarom voor gekozen geen vergunning aan te vragen voor de ontzanding van het 2e traject maar te zoeken naar een meer pragmatische aanpak met beheermaatregelen bovenstrooms om verdere aanzanding op ongewenste plekken zoveel mogelijk te voorkomen.

Waterwerken zuidelijk deel van de Bekendelle

De werkzaamheden voor de vernatting van het zuidelijk deel van de Bekendelle (M2a en M2b) zijn uitgevoerd in 2019. Dit betreft de aanleg van 2 gronddammen, 6 overlaten, 2 duikers, 2 voordes en het verondiepen en dempen van watergangen.

De voorde in de Weg om Ros en Lintum is in beheer bij de gemeente als eigenaar van de weg. De overige maatregelen zijn op particulier terrein.

De provincie is verantwoordelijk voor de doelrealisatie van de Natura 2000 aangewezen habitats. Als de kunstwerken niet het juiste effect op de waterhuishouding geven, of als er onderhoud aan de kunstwerken nodig is, kan zij hier de eigenaar op aanspreken op basis van de Nb wet. De eigenaren in de Bekendelle hebben zich in het verleden verzet tegen de aanwijzing van het gebied als Natura 2000 en tegen het beheerplan Natura 2000. Het is daarom niet logisch, en ook niet wenselijk, om het beheer en onderhoud van de watergangen en kunstwerken bij de particuliere eigenaren te beleggen. Het bestuur van het waterschap Rijn en IJssel wil daarom overwegen om, in uitzondering op het vigerende beleid om kleine watergangen af te stoten, de watergangen en werken die van belang zijn voor de instandhouding van de Natura 2000 doelen een plek te geven op de legger. Daarmee kan het beheer en onderhoud belegd worden middels de keur bij het Waterschap. Dit betreft het beheer en onderhoud van de waterwerken die aangelegd zijn in het kader van de uitvoeringsovereenkomst Natura 2000 maatregelen provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel (getekend 21 september 2019).

De totale kosten voor het beheer en onderhoud zijn in beeld gebracht in het Beheer- en Onderhoudsplan. Het beheer en onderhoud van de in particulier eigendom gelegen watergangen en kunstwerken in dit deel van de Bekendelle is geraamd op circa € 150.000,- over een periode van 25 jaar (incl. 10% onvoorzien en 21% BTW).

De provincie Gelderland sluit hiervoor een financiële overeenkomst af met het Waterschap Rijn en IJssel om het beheer en onderhoud van de werken over te dragen (initiatief provincie Gelderland).

Inrichtingsmaatregelen op particulier terrein

In het kader van de uitvoeringsovereenkomst is op dit terrein een raster aangelegd (M2c). Het raster komt in beheer bij de eigenaar.

Mister Mark W.L.

De Mister Mark W.L. is verondiept (M2d). Dit is een legger watergang. Het beheer en onderhoud is belegd bij het Waterschap.

MEMO

Aan : Uitwerking N2000-maatregelen Bekendelle
Organisatieonderdeel : Projectgroep

Van : 5.1.2e
Organisatieonderdeel : Kennis en Advies
Datum : 2 juli 2017
Onderwerp : Onderbouwing M1B: Aanleggen waterretentiegebieden Boven Slinge

Inleiding

De GGOR-maatregelen voor Natura2000 gebied Bekendelle zijn opgenomen als maatregel voor Natura2000 gebied 063 Bekendelle, Provincie Gelderland.

M1B: aanleggen waterretentiegebieden Boven Slinge

Maatregel M1B: aanleggen waterretentiegebieden Boven Slinge gaat over de aanleg van meerdere kleinschalige waterretentiegebieden bovenstrooms van Bekendelle om de afvoerpieken door de Bekendelle te dempen. In totaal is er sprake van een retentiebehoefte van 23ha met 80.000 m³.

In onderstaande tabel zijn alle bovenstrooms gelegen retentiegebieden opgenomen. Het zijn gebieden die jaarlijks kunnen en mogen inunderen en als zodanig zijn ingericht. Het betreft gebieden die grotendeels in eigendom van het waterschap zijn.


gebied / traject	ha	m ³	gem. waterdiepte	uitvoering
Landgoed Den Schooten	7.8	11600	15 cm	2011
Burloseweg	7.0	20900	30 cm	2015
Te Voortwis	4.0	12000	30 cm	2013
Kavelruil Freeman div.	3.2	9600	30 cm	2013
Osink-Bemersbeek "De Roos"	3.4	10000	30 cm	onbekend
Osinkbeek en Schippersbeek	6.0	23300	40 cm	>2017
Overige inrichtingsprojecten geen eigendom WRIJ	2.2	6600	30 cm	divers
totaal	33.6	94000	28 cm	

Conclusie

Na het uitvoeren van het project Osinkbeek en Schippersbeek is de retentiedoelstelling van 23ha en 80.000m³ gehaald.

Kaart

Hieronder het kaartbeeld met de ligging van de retentiegebieden (rode gebieden).

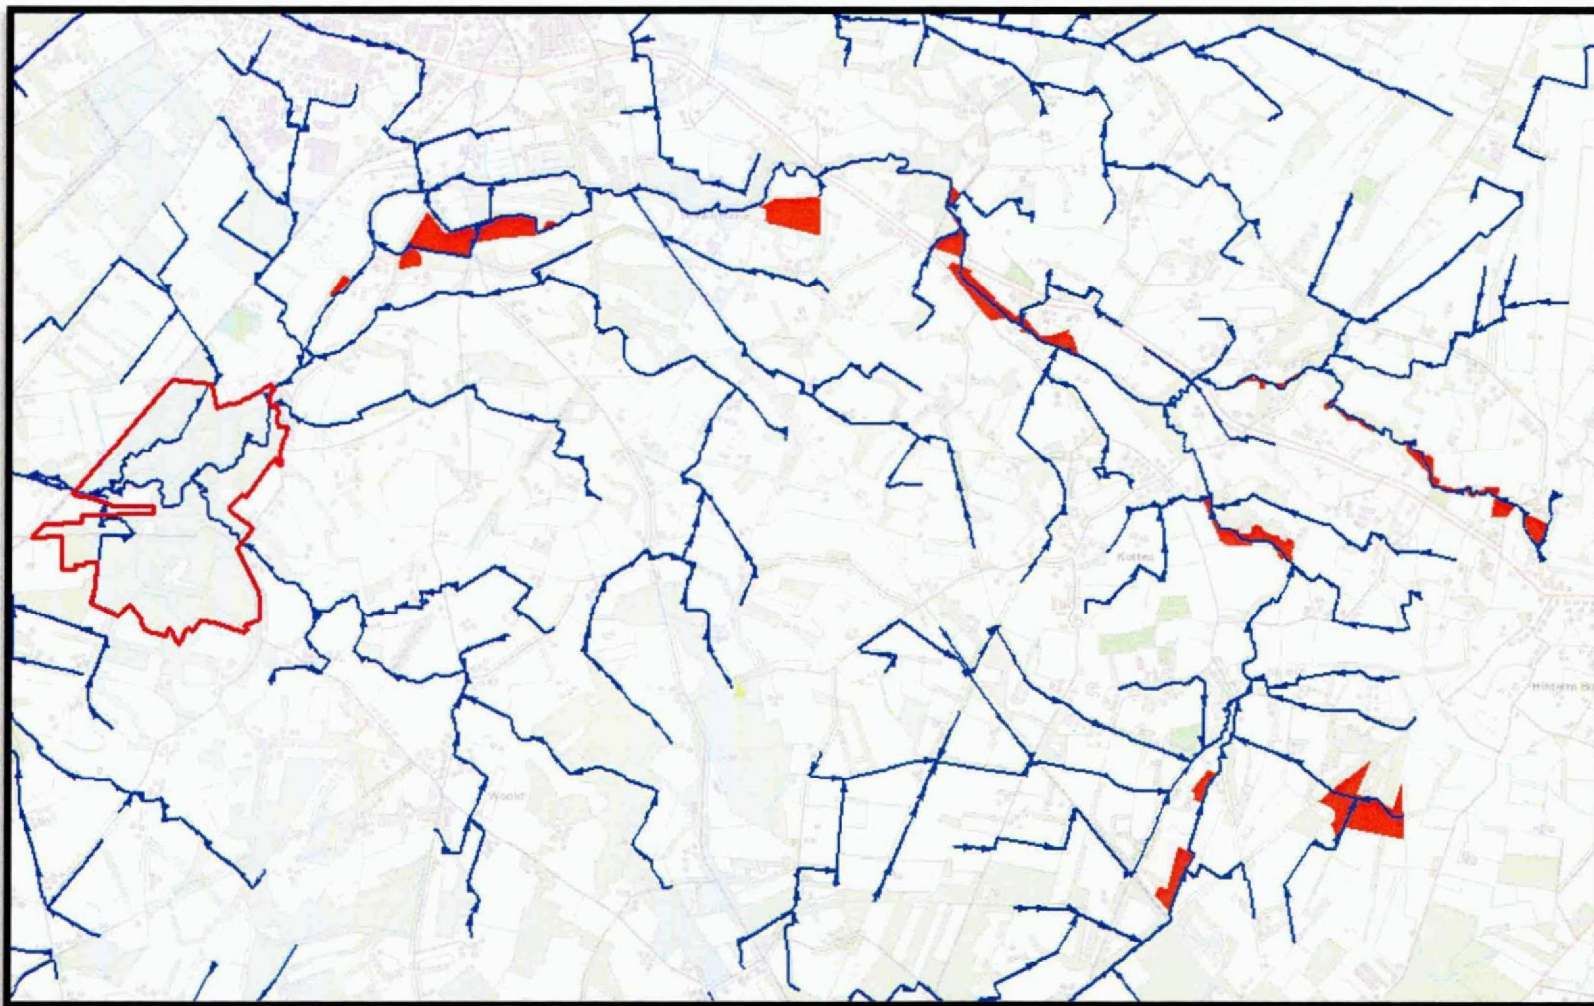

Kaart met contouren Bekendelle (rood kader links) en kleinschalige retentiegebieden bovenstrooms (rode gebieden).

MEMO

Aan : Uitwerking Natura 2000 maatregelen Bekendelle
Organisatieonderdeel : Projectgroep

Van : 5.1.2e
Organisatieonderdeel : Kennis en Advies
Datum : 10 nov 2017
Onderwerp : Onderbouwing schrappen M1D: herstel oude geul door
aanpassen voetbrug Boven Slinge

Inleiding

De GGOR-maatregelen voor Natura 2000 gebied Bekendelle zijn opgenomen als Natura 2000 maatregelen voor gebied 063 Bekendelle.

Het waterschap geeft in dit MEMO de onderbouwing richting Provincie om maatregel M1D op basis van een nadere analyse, **niet** uit te voeren.

M1D: herstel oude geul door aanpassen voetbrug Boven Slinge

In de gebiedsanalyse staat het volgende:

*“Ter plaatse van de houten voetbrug in de Boven Slinge ligt een geul die bij hoogwater kan gaan mee stromen. In het verleden is het voetpad door deze geul verhoogd om deze laaggelegen gronden beter toegankelijk te maken. Daarmee is de **afvoerfunctie** van de oude geul verminderd geworden. Door het verhoogde pad weer te verlagen, gevolgd door de aanleg van een extra lengte voetbrug ter plaatse van het verlaagde pad, kan de **bypass-functie** van de oude geul worden hersteld en de **opstuwing** hier worden verminderd.”*


Nadere analyse

In bovenstaande beschrijving wordt verondersteld dat de oude geul een afvoerfunctie had. Het waterschap gaat daar niet vanuit en dat blijkt uit het feit dat de oude geul geen onderdeel van de legger uitmaakt.

Dat betekent dat de hydraulische modelberekeningen uitgaan van de Boven Slinge zonder meestromende geulen. Uit de modelberekeningen van het waterschap waarin de Houten brug is opgenomen, blijkt dat de opstuwing van de Houten brug bij extreme afvoeren ordegrootte 5 cm is en daarmee geen belemmerende factor vormt in de afvoer.

Bovendien zijn de genoemde geulen dermate begroeid en grillig, dat er per saldo nauwelijks sprake zal zijn van een constructieve bijdrage aan de afvoercapaciteit.

De bypass-functie die benoemd wordt in de gebiedsanalyse is behouden gebleven. Zie onderstaande kaartbeeld van de maaiveldhoogte. De blauwe lijn geeft de bypass-functie aan.

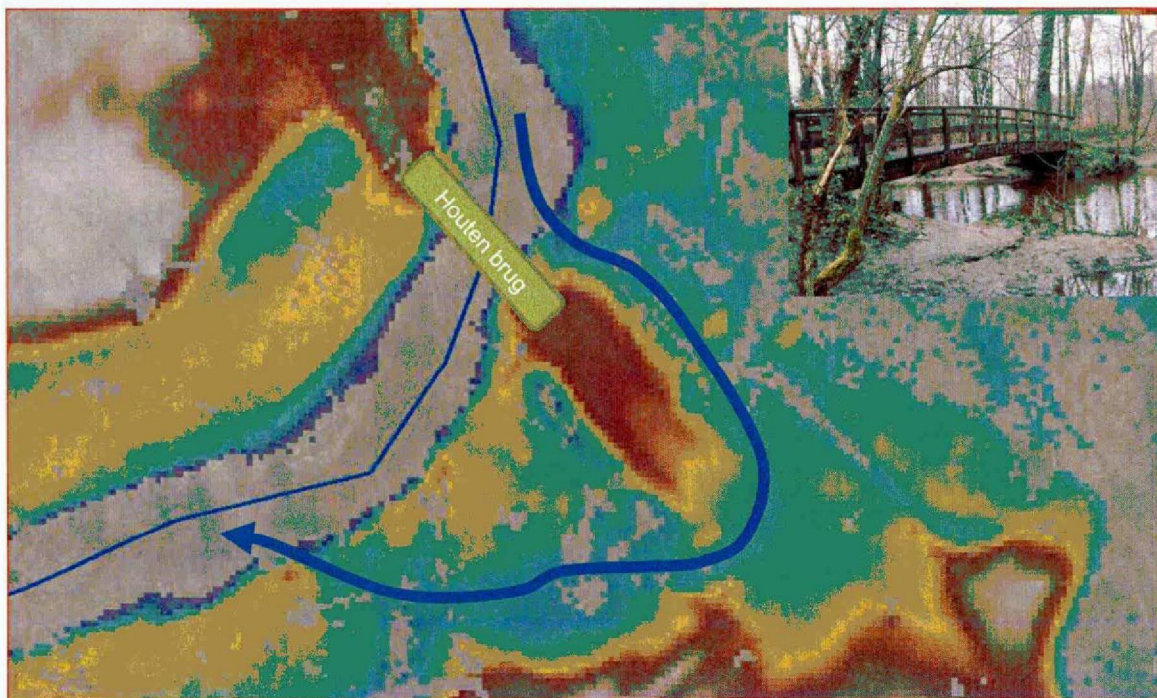

Ter info: met de afvoercapaciteit van eventuele meestromende geulen wordt door het waterschap geen rekening gehouden, omdat:

- de werkelijke afvoercapaciteit ervan zeer laag wordt verondersteld vanwege de ruwheid door begroeiing;
- het waterschap de afvoercapaciteit niet kan garanderen doordat de geulen niet op de legger staan en niet beheerd en onderhouden worden.

Conclusie

Op basis van de nadere analyse wordt gesteld dat de huidige constructie van de Houten brug, inclusief verhoogde aanlooppaden:

- geen onwenselijke beperking van de afvoerfunctie heeft;
- niet voor onwenselijke opstuwing zorgt;
- de bypass-functie niet aantast.

Het beoogde doel van deze maatregel komt daarmee te vervallen.
