

BEZOEKRAPPORT

BETREFT: Stortplaats Doonweg, SCA de Hoop, VAR, Beuth Beheer, PFW/Givaudan Roure, VIKa, Akzo Nobel Ede, Parengo

Datum laatste controle : onbekend
Controledatum : 11/12 augustus 1997
Aanvang controle : 21.00 uur
Einde controle : 00.30 uur

Rapport door : 5.1.2e

Aanleiding bezoek:

- Structurele controle bedrijven
- Milieumelding, augustus 1997/div. nummer(s)

Soort controle:

- Represieve aspect controle

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- WM-vergunning diversen

Controlegegevens (algemeen)

Rondrit Veluwe naar aanleiding van diverse klachten c.q. storingsmeldingen:
Temperatuur 21 tot 24 °C. Zwakke oostelijke c.q. noord-oostelijke wind.

Tijd:	Plaats	Omschr. geur	Oorzaak:	Waarneemb.	Hinderl.
21.00	A-328/ VELP	rioollucht	onb.	+	+
21.30	Wilh.park EERBEEK	terpenen	bos	+	-
21.35	Doonweg/ Soerensezand	H2S-lucht	stortpl.	-/+	-
21.40	Lage weg	H2S-lucht	Industrie water	++	++
21.45	Coldenh. H.wijkweg	Papier/hooi	De Hoop Pilo-pak	++	++
21.50	't Haagje	Rioollucht	De Hoop	+	++
22.05	Ardeweg t/zA1 Wilp	compostlucht	VAR	++	-/+
22.06	Ardeweg t/nA1 Kranenstr. Leemsteeg Zwaluwweg Aerdenbroek Aerdenbroek Zutp.weg Apeld.weg	Compostlucht Vislucht Vislucht Compostlucht	VAR Nertsf. Nertsf. VAR	geen geen geen geen ++ ++ ++ ++	-/+ ++ ++ -/+

22.30	Harselaarsw. BARNEVELD			geen	
	Harselaarsw./ Handelsweg	Houtlucht	Europa- Parket	++	-/+
22.35	Nijkerkerweg	Chemisch	PFW/GR	++	+
22.40	Nijkerkerweg doodl.ged.	Chemisch	PFW/GR	++	+
23.15	Kernhemsew. EDE	Terpenen uitlaatgassen	bos verkeer	+	-/+
23.20	Nizolaan	Kaaslucht	VIKA	+	+
23.30	Bennekomsew.	H2S-lucht	AKZO	++	++
	Baron. v. W.			geen	
	Frans H.I.			geen	
	Rembrandtlaan			geen	
23.50	Ritsm.Bosmw RENKUM	Terpenen Papier/H2S	Parenco	+	+
	Dorpstraat	Papier/H2S	parenco	++	+

Verklaring:

- niet hinderlijk
- /+ redelijk waarneembaar of redelijk hinderlijk
- + goed waarneembaar of hinderlijk
- ++ sterk waarneembaar of erg hinderlijk.

Afhandelingsgegevens

- Geen verdere actie

Ondertekening toezichthouder: 5.1.2e

Arnhem, 12 augustus 1997

Kopie:

- MW : archief
- MW/IBM/PMW

Kopie via mail:

- MW/IBM/MV : 5.1.2e
- MW/IBM/HA : 5.1.2e
- MW/IBM/HA : Senior TB
- Overige : MKIC

B E Z O E K R A P P O R T

BETREFT: Stort Doonweg

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Stort Doonweg B.V.
Adres : Kanaalweg 8a
Postcode : 6961LW
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e
Telefoon : 0313- 5.1.2e
Aard bedrijf : stortplaats

Naam inrichting : stort Doonweg
Adres : Doonweg
Plaats : Eerbeek

Datum laatste controle : 19-1-2000
Controledatum : 25-4-2000
Aanvang controle : 12.30 uur
Einde controle : 14.00 uur

Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	toezichthouder	provincie Gelderland
	senior vergunningen	provincie Gelderland
	directeur	Industriewater

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- WM-vergunning d.d. 22 februari 1996 MW-nr. 93.35874-6093034
- Provincie bevoegd gezag

Controlegegevens (algemeen)

Aanleiding van dit bezoek was dat 5.1.2e als bedrijfscoördinator stort Doonweg en stort Mayr Melnhof eens wilde bezichtigen.

We hebben de gehele stort rondgelopen en het enige punt dat voor zover ik kon overzien niet conform de vergunning is, is dat regenwater, dat in contact met afval is geweest, afstroomt naar een laagte in het terrein waar geen vloeistofdichte bodembescherming aanwezig is. In deze put was inmiddels wel een sliblaagje gevormd, waardoor het water nadat het peil voldoende hoog was via een pijpje kon afstromen naar de vloeistofdichte percolatiewatersloot. Ik heb 5.1.2e gevraagd om hiervoor een voorziening te treffen zodat het water niet in de bodem kan zakken. Op 15 mei, tijdens een overleg over stort Doonweg, deelde 5.1.2e mee dat hij dit probleem verholpen heeft. Ik ben nog niet op locatie geweest om dit te controleren.

Ondertekening toezichthouder: 5.1.2e

Arnhem, 28 juni 2000

5.1.2e

(datum + handtekening)

Kopie:

- MW	:	archief
- MW/I/CPK	:	
- Senior TB	:	5.1.2e



B E Z O E K R A P P O R T

BETREFT: Stortplaats Industriewater Eerbeek B.V.

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Industriewater Eerbeek B.V.
Adres : postbus 13
Postcode : 6960 AA
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e / 5.1.2e
Telefoon : 0313- 5.1.2e
Aard bedrijf : monodeponie papierafval

Datum laatste controle : 8 augustus 1997
Controledatum : 27 augustus 1997
Aanvang controle : 10.30 uur
Einde controle : 12.00 uur
Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	chef stortplaats	Stort Doonweg B.V.
	jurist	prov. Gld.

Aanleiding bezoek:

- structurele controle
- milieumeldingen nr. 279 (juni 1997), 139, 144 (juli 1997), 56, 57, 63, 64, 72, 73, 93, (augustus 1997)

Soort controle:

- hercontrole

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- Wm-vergunning d.d. 22 februari 1996, kenmerk MW 93.35874-6093034 (inwerking getreden per 26 mei 1997)
- provincie bevoegd

Controlegegevens (algemeen)

Gesprek BBEZ

Voorafgaand aan het bezoek aan de stortplaats hebben wij een gesprek gevoerd met drie vertegenwoordigers van de Belangenvereniging Bewoners Eerbeek Zuid, te weten 5.1.2e en 5.1.2e. Bij de BBEZ bestaat een sterk gevoel dat de provincie geen harde actie richting Stort Doonweg B.V. wil nemen (zie o.a. de fax van 5.1.2e d.d. 13 augustus 1997). Het gesprek is bedoeld om de situatie op de stortplaats, de recente klachtenstroom en de daaropvolgende actie van de provincie te bespreken.

Wij hebben aangegeven dat de situatie op de stort niet conform de afspraken en de nieuwe vergunning is. Met name de aanleg van diverse voorzieningen t.b.v. de verticale uitbreiding geven veel

overlast.

Wij hebben aangekondigd om een advies richting GS te sturen waarin wij zullen aandringen op (bestuursrechtelijke) maatregelen. Inhoeverre GS dit advies overneemt is nog niet aan te geven tijdens het overleg met BBEZ.

Overigens geeft 5.1.2e aan dat recentelijk gedurende het warme weer niet geklaagd is terwijl wel (ernstige) overlast is ondervonden. Men heeft het idee dat het klagen geen zin meer heeft.

Overigens geeft 5.1.2e aan dat hij heeft gehoord dat enkele malen wel afval is aangevoerd, maar niet is afgedekt conform de eis van de Raad van State. Ook het storten buiten de aangegeven werktijden komt voor.

Ik heb 5.1.2e meegedeeld dat indien mogelijk hij foto's of video-opnamen maakt van deze activiteiten om het bedrijf daarmee te kunnen confronteren.

Het handhavingsverzoek dat de BBEZ heeft ingediend bij de provincie, is nog steeds niet behandeld door de provincie. 5.1.2e 5.1.2e vraagt wanneer dat gaat gebeuren, het duurt veel te lang.

Overigens heeft de Raad van State een adviseur ingeschakeld aangaande de bodemprocedure. Hierover is de BBEZ geïnformeerd middels een faxbericht d.d. 1 juni 1997.

Controle stortplaats Stort Doonweg B.V.

5.1.2e is telefonisch benaderd om het bezoek te begeleiden. Hij gaf aan dat hij vanwege een vergadering niet aanwezig kan zijn. Middels een transport naar het stort zijn wij naar binnen gegaan.

Illegale opslagen

Op de stort, nabij de opslagtank van dieselolie, is een dichte container met bovenop een aansluitingsmogelijkheid aangetroffen. een chauffeur van een vrachtwagen heeft aangegeven dat in de container resten van pindavliesjes zitten. Deze container wordt tijdelijk op de stort door transporteur Noordermeer gestald in afwachting van afvoer naar 'Kesteren" (drogerij Van Tuijl?). Deze opslag van afval is illegaal.

De opslag van metalen, waaronder fietsen, is nog steeds aanwezig (zie vorige controleverslag). De fietsen zijn nu echter in een container gedaan. Qua omvang is de opslag niet/nauwelijks veranderd.

De opslag van olieprodukten bij de opslagtank is nog onveranderd sinds de vorige controle. In één van de vaatjes is een ontluchtingsgat deels afgedekt met een oude schroevendraaier. Bij omvallen is het risico op verontreiniging groot.

Boven op de stort in het midden van de inrichting zijn wederom twee extra mobiele opslagtanks voor brandstoffen aangetroffen. De tanks zijn goed afsluitbaar tegen vandalisme. De container waarin de tanks zitten is mogelijk tevens opvangbak bij lekkages, echter hierover is mij niets bekend (niets gemeld).

Stortfront

Op het stortfront is goed te zien dat enorme hoeveelheden oude sli블lagen met rejets op de 'oude' stortwal zijn gestort. Deze aangevoerde sli블lagen zijn niet afgedekt.

Het gat in de wal is niet geheel hersteld. De hoogte van de wal is meer dan drie meter.

Net achter de wal ligt nog een behoorlijk restant van het 'percolaatmeer' dat is ontstaan tijdens de werkzaamheden in juli j.l.

De afvoer van percolaatwater naar de rand van de stort verloopt kennelijk slecht.

Op de stortwal is de vrijkomende geur goed waarneembaar.

Aan de spoorzijde is op het talud de drain voor het percolaat aangetroffen. Deze loopt langzaam, terwijl toch nog veel percolaatwater aanwezig is.

Het percolaat loopt over een deel van het talud naar de rand van de stort en bezinkt daar gedeeltelijk in de bodem. Het overige deel blijft staan in de greppel die aanwezig is. Ter plaatse is de geur goed waarneembaar terwijl de wind zuid westelijk is (niet over de stort waait).

Hierdoor is het percolaat (weer) een geurbron geworden. In het verleden is bij geurmetingen dat percolaatwater niet meer meegenomen omdat het niet meer zou ontstaan en in greppels achter zou blijven. In de vergunningaanvraag is het percolaat als geurbron erkend (zie o.a. vorige controleverslag).

Werkzaamheden t.b.v. verticale uitbreiding

Een kraanmachine is bezig om langs de Doonweg nabij het spoor de ruimte naast het stortlichaam te egaliseren (inspectieweg en ringsloot).

Deze kraan is gedurende de hele dag bezig, waaronder een groot gedeelte op deze plaats.

Langs het zuidelijke talud van het stortlichaam is een kraan bezig met het restylen van het afval. Hierbij wordt veel oud afval waaronder slib verplaatst. Ook oud afval is een erkende stankbron bij verplaatsen.

Langs de rand aan de zuidkant is een kraanmachine bezig met het egaliseren van het terrein. Hier wordt mogelijk ook de aanleg van de inspectieweg en de greppel voorbereid.

Geluidsbronnen

In totaal zijn tegelijkertijd 4 geluidsbronnen actief op het stort gedurende meerdere uren, mogelijk de gehele dag.

Volgens eerdere berekeningen wordt hiermee mogelijk de geluidsnorm op 50 meter buiten de inrichting overtreden.

Afhandelingsgegevens

- GS-brief met bestuursrechtelijke maatregelen

Ondertekening toezichthouder: [REDACTED] 5.1.2e

[REDACTED] 5.1.2e Arnhem, 28 augustus 1997

Bijlage: : fotoreportage

Kopie:

- MW : archief
- PMW : [REDACTED] 5.1.2e

Kopie via mail:

- MW/IBM/MV : [REDACTED] 5.1.2e
- MW/IBM/HA : [REDACTED] 5.1.2e
- MW/IBM/HA : Senior TB

h:\wp\industri\bz25indu

Stort Doonweg Eerbeek



Stort Doonweg Eerbeek



Stort Doonweg Eerbeek



Stort Doonweg Eerbeek



Stort Doonweg Eerbe




6/6

Stort Doonweg Eerbeek



1/2

Stort Doonweg B.V. gemeente Brummen

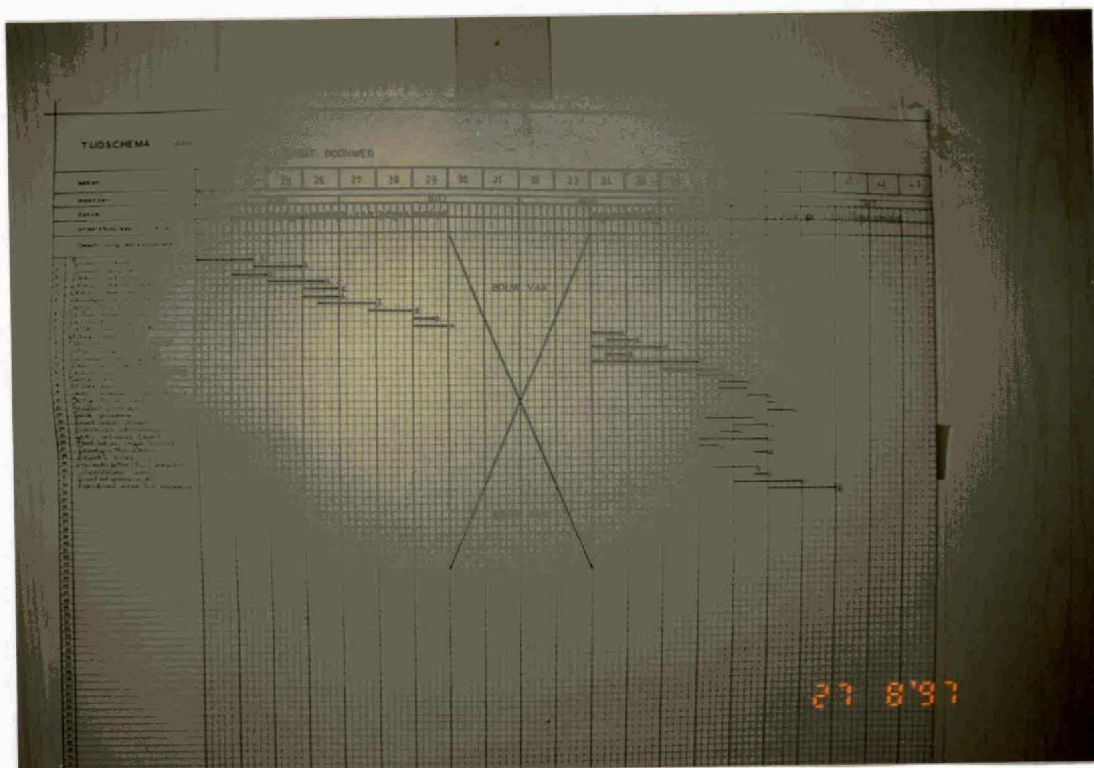

2/7

Stort Doonweg B.V. gemeente Brummen



3/7

Stort Doonweg B.V. gemeente Brummen



4/7

Stort Doonweg B.V. g



5/8

Stort Doonweg B.V. gemeen





Stort Doonweg B.V. gemeente E



6/3

8/2

Stort Doonweg B.V. geme

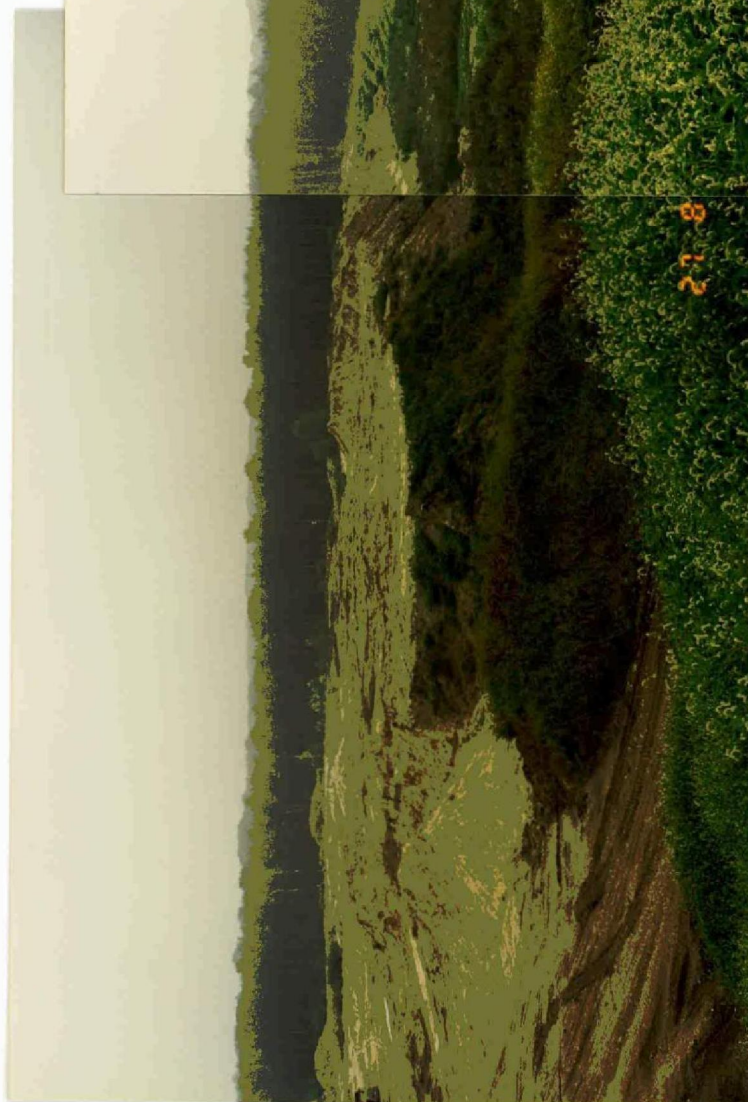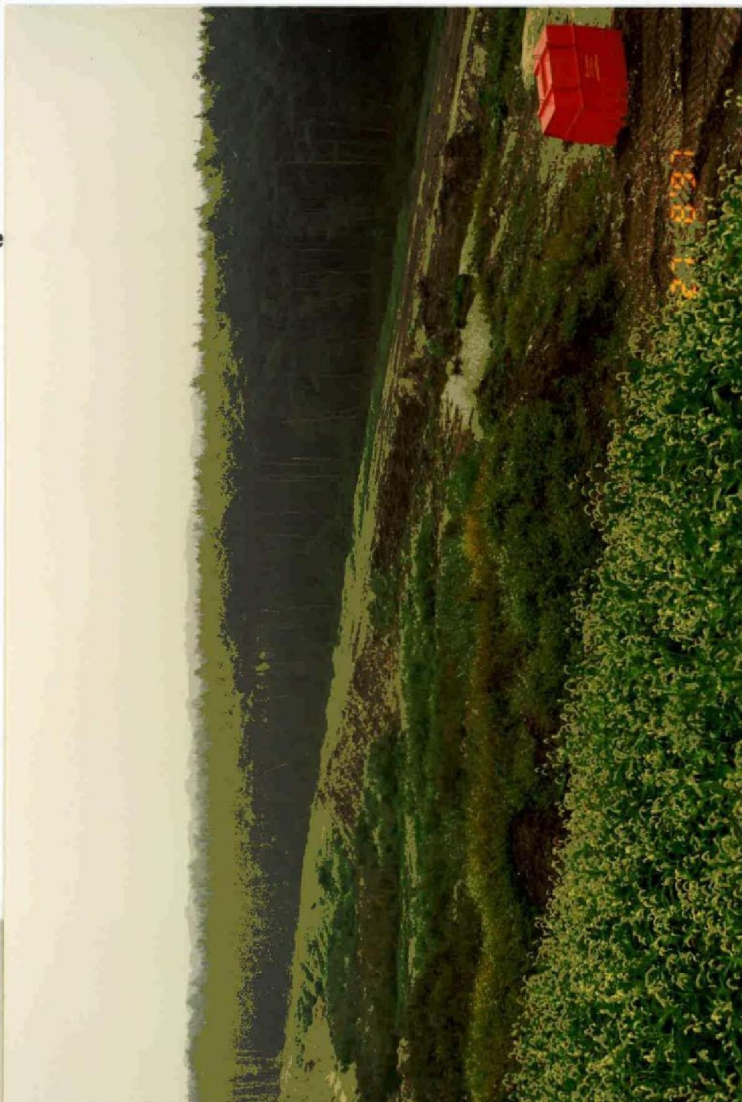

Archief

46

B E Z O E K R A P P O R T

BETREFT: Stortplaats Industriewater Eerbeek B.V.

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Industriewater Eerbeek B.V.
Adres : postbus 13
Postcode : 6960 AA
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e 5.1.2e
Telefoon : 0313- 5.1.2e
Aard bedrijf : monodeponie papierafval

Datum laatste controle : 8 april 1997
Controledatum : 8 augustus 1997
Aanvang controle : 10.30 uur
Einde controle : 12.30 uur
Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	medewerker	Stort Doonweg B.V.
	chef stortplaats	Stort Doonweg B.V.

Aanleiding bezoek:

- structurele controle
- milieumeldingen nr. 279 (juni) 1997
139,144 (juli) 1997
56,57,63,64,72,73,93 (augustus) 1997

Soort controle:

- hercontrole

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- Wm-vergunning d.d. 22 februari 1996, kenmerk MW 93.35874-6093034 (inwerking getreden per 26 mei 1997)
- provincie bevoegd

Controlegegevens (algemeen)

Vergunnings situatie

Door het intrekken van de verzoeken om schorsing door omwonenden en Industriewater/Stort Doonweg B.V. is de vergunning van kracht geworden per 26 mei 1997 (datum waarop de provincie in kennis is gesteld van het besluit van Stort Doonweg; intrekking door omwonenden al eerder gebeurd).

Aanleiding locatiebezoek

In korte tijd zijn een aantal klachten over geluid en stank binnengekomen (zeer warm weer en oostelijke wind). Deze klachten zijn de eerste na een relatief lange rustige periode.

Bezoek Wilhelminapark

Ter plaatse in het Wilhelminapark is het volgende waargenomen.

Stank

De geurdrempel ligt ten tijde van het bezoek op de rand van het bosje dat grenst aan het Soerense Zand (zandpad). Enkele vlagen bereiken zelfs het zandpad. Ter hoogte van de woningen aan de Louise de Colignylaan heb ik geen geur waar kunnen nemen. Bij navraag bij bewoners van een woning ter plaatse kreeg ik te horen dat de stank op 7 augustus heel erg zou zijn geweest dat deze bewoners naar binnen zijn gevlucht (en dat bij het warme weer). Tevens kreeg ik de opmerking te horen dat het klagen over stank geen enkele zin zou hebben. De provincie doet toch niets omdat het kapitaal van de papierindustrie spreekt.

Ook op de Doonweg langs de zijde van de stortplaats en het spoor heb ik de stortlucht zeer duidelijk waargenomen. Een vrachtwagen met slib van Industriewater rijdt op dat moment de stortplaats op. Ik heb zeer duidelijk waargenomen dat deze vrachtwagen enorm stinkt, ondanks de afgesloten container.

Geluid

Op de achtergrond is duidelijk het geluid te horen van machine(s) op het stortfront. Onduidelijk is hoeveel machines zijn te horen en of daarmee zal worden voldaan aan de geluidsnorm uit de vergunning. Wel zijn de machines werkzaam achter een wal van papierafval, hetgeen deels geluid tegenhoudt.

In een klachtmelding over de Stort Doonweg is aangegeven dat op 12 augustus 1997 na 19.00 iets (afval?) is gestort. De vergunning geeft aan dat de openingstijden van 7.30 tot 17.00 uur gelden.

- * Vs. 2.1 openingstijden Stort Doonweg
Hoewel niet zelf geconstateerd, is elke activiteit op het stort na 19.00 uur verboden. De aanvoer van afvalstoffen vlak voor sluitingstijd is niet toe te staan aangezien de verwerking dan niet goed mogelijk is.

Gelet op de inhoud van de notitie van 7 augustus 1997, waarin staat dat meer dan 4 vrachtwagens actief zijn geweest op de stortplaats gedurende de afgelopen maand juli, is sprake van overtreding van de geluidsvoorschriften (zie brief 29-1-96, kenmerk MW96.5652). Zie ook reactie Industriewater d.d. 20-2-96.

- * Geluidsvoorschriften overtreden.

Bezoek Stort Doonweg

Met 5.1.2e heb ik het stort gecontroleerd.

Geluid

Op het stortfront valt mij meteen op dat er naast de shovel ook een graafmachine en een kraanmachine aanwezig zijn. De graafmachine loopt samen met de shovel stationair terwijl er slechts één persoon aanwezig is om ze te bedienen.

Stank

Op het stortfront is duidelijk te zien dat enorm veel papierafval overhoop is gehaald bij het aanleggen van drains langs de gehele stortplaats.

5.1.2e deelt mee dat circa 4 weken geleden de situatie uit de hand is gelopen. Toen is begonnen met het aanleggen van de drains en het aanpassen van de taluds conform de nieuwe vergunning. Op dat moment is o.l.v. de Heidemij de hoeveelheid afgegraven en op het stortfront gestorte oude papierafval zo groot geweest dat het niet (goed) te verwerken is geweest. Tevens is door de enorme omvang van het afval de afvoerleiding van water van het stortfront naar de bodem onder aan het talud verstopt geraakt. Hierdoor is een enorme plas dood, zwart stinkend water op het stortfront blijven liggen.

Door vakantie van 5.1.2e en 5.1.2e is deze situatie blijven bestaan en heeft bij de recente oostenwind geleid tot ernstige stankklachten.

Sinds week 32 zijn 5.1.2e en 5.1.2e bezig om de situatie weer normaal te krijgen. Belangrijkste probleem was de plas water die de berijdbaarheid van het stortfront sterk verslechterde. Afvoer per as (zoals in het verleden) zou volgens Sopjes niet kunnen omdat de loonwerker vanwege varkenspest het materiaal niet mag inzetten. Daarom is men nu bezig met het opnieuw uitgraven van de sleuf en aanleggen van een nieuwe drain voor de afvoer van het water naar het talud aan de spoorzijde.

De wal van papierafval is erg hoog, maar ziet er niet goed verzorgd uit. Tevens is een gat gemaakt in het midden van de wal om de drain aan te kunnen leggen. Door dat gat is aan de andere zijde goed de stortgeur te ruiken en het geluid van machines te horen.

Volgens mij is een groot gedeelte van het teveel aangevoerde papierafval op de wal gedumpt om ruimte te houden voor werkzaamheden achter de wal.

Het zojuist aangevoerde paperslib van Industriewater heeft gedurende de gehele controle op de stortplaats onaangeroerd en niet afgedekt liggen uitwalmen. Later is zelfs een tweede vracht bijgestort zonder dat direct is afgedekt. Ook bij vertrek van de stortplaats is het slib nog niet afgedekt.

Het lijkt erop dat de verkeerd gelopen werkzaamheden teveel vergen van één persoon om het bij te kunnen werken terwijl de dagelijkse werkzaamheden doorgaan. Met name het afdekken van slib/oude sliblagen is gedurende langere tijd niet gebeurd.

Op diverse plaatsen op het oude gedeelte van de stort liggen bergen met ontgraven oud papierafval. Ook zijn divers bassins aangetroffen met percolaatwater. Beide zaken dragen bij aan het ontstaan van extra geur.

Het in gebruik zijnde stortfront is gelijk aan de lengte van de stortwal en bedraagt circa 100 meter. Over deze lengte ligt

onafgedekt papierafval en is de dozer actief bezig met het verschuiven van afval. Ook het vergraven van oude papierlagen met slibresten op diverse plaatsen op de stortplaats draagt bij aan het vergroten van het daadwerkelijk in gebruik zijnde stortfront als zijnde een geurbron.

Bij de heersende oostenwind levert dat extra geurbelasting (hinder) voor de omgeving op.

* Vs. 1.5

De aanleg van de drains en de afwerking van de taluds in de zomerperiode waarin diverse keren de klachtenstroom een piek bereikt, is niet vooraf gemeld aan de provincie. Doordat bij deze werkzaamheden oude sliblagen verwijderd moeten worden, is extra geuruitstoot te verwachten. De vergunningaanvraag geeft duidelijk aan dat dergelijke werkzaamheden t.a.v. het herstellen van taluds in de toekomst niet meer zouden plaatsvinden. Hiermee erkent de aanvrager dat deze werkzaamheden geurhinder veroorzaakt (aanvraag, nader geuronderzoek TNO 19 december 1995 Kenmerk 93.35874, pag. 11 en 14).

Ook de aanwezige percolaatvijvers zijn in het verleden bestempeld als mogelijke geurbronnen. Deze zijn destijds niet meer aanwezig geweest of geregeld leeggehaald. Momenteel liggen er weer diverse plassen/bassins met percolaatwater, waaronder de grootste op het stortfront als gevolg van de drain-werkzaamheden (oppervlak is minstens 100 m² geweest).

* Vs. 1.8

Het toezicht door de vergunninghouder op de uit te voeren werkzaamheden lijkt tekort te zijn geschoten. Evenmin zijn er schriftelijke instructies bij de provincie bekend waarmee de uitvoerende rekening moeten houden.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn 5.1.2e en 5.1.2e (deels) afwezig vanwege vakantie.

* Vs. 1.13

De houder van de vergunning dient ervoor zorg te dragen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

* Vs. 5.1.1

Alle werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat geen ontoelaatbare stankhinder voor de omgeving wordt veroorzaakt.

* Vs. 7.1.3

Binnen een maand na van kracht worden van het voorschrift moet een wal zijn aangelegd bij stortfront.

* Vs. 7.1.4

De wal moet zijn aangelegd met geschikt materiaal zijn aangelegd. Aan de buitenzijde moet dat materiaal afgedekt worden met grond of andere materiaal dat geurhinder of

verwaaiing voorkomt.

- * Vs. 7.2.7
Afvalstoffen moeten direct na aflevering op het stortfront worden uitgereden, geëgaliseerd en verdicht.
In de aanvraag staat dat voor de geurmeting het slib per lading wordt ondergewerkt alvorens de volgende container gestort kan worden (aanvraag bijlage 11 Geur, hoofdstuk 5; Bronsterkte).
- * Vs. 7.2.9
De gestorte afvalstoffen moeten in ieder geval zodanig worden afgedekt dat geurhinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- * Vs.
De lengte van het stortfront mag maximaal 50 meter breed zijn.

Overige opmerkingen

Op de stortplaats zijn een tweetal extra opslagunits voor brandstoffen geplaatst. Tevens is een tractor aanwezig. Deze worden gebruikt voor de werkzaamheden op de stort t.b.v. het inrichten volgens de nieuwe vergunningvoorschriften.

- * Vs. 1.1 en 1.5 afwijkingen van aangevraagde situatie
Vooraf is duidelijk geweest welke activiteiten uitgevoerd moeten worden om aan de nieuwe vergunning te kunnen voldoen (herinrichting stortplaats). Deze activiteiten zijn van invloed om m.n. geluid- en geurproductie waardoor hinderlijke situaties kunnen ontstaan. Zoals in april 1997 al met dhr Sopjes is afgesproken, zou een planning met deze activiteiten en de daarbij behorende beschermende voorzieningen tegen hinder, aan de provincie worden toegezonden. Op basis daarvan kan dan bepaald worden of voldoende zorgvuldigheid wordt betracht om overlast te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te voorkomen.
De extra inzet van materieel en extra opslag van brandstoffen zijn niet conform de gedoogbeschikking/vergunning gemeld.

Op de stort staan een tweetal containers met daarin allerlei, deels uitgesorteerde, oude metalen. Tevens staan een dertigtal oude fietsen achter de containers (verdekt) opgeslagen. Hiervoor is in het verleden al gewaarschuwd (zie GS-brief 29 januari 1996).

Volgens 5.1.2e is een vrachtwagenchauffeur hier mogelijk verantwoordelijk voor.

Ook liggen diverse andere kunststoffen materialen (enkele in originele verpakking) nabij de containers op de grond (o.a. kattenluikjes).

- * Vs. 2.4/2.5 inspectie bij de poort
Inspectie van aangevoerde afvalstoffen heeft kennelijk niet plaatsgevonden. Indien de camera-inspectie goed wordt

uitgevoerd, dan moet terug te vinden zijn wie wanneer de afvalstoffen heeft aangevoerd.

- * Vs. 6.1.1.
Acceptatie van bedrijfsafvalstoffen afkomstig van papierproductie en niet verontreinigd BSA wordt niet nageleefd.
 - * Vs. 6.1.2
Alleen acceptatie van bedrijfsafvalstoffen van papierproductie afkomstig van betreffende papierfabrieken. De fietsen en kunststoffen zijn absoluut niet afkomstig van de papierfabrieken.
 - * Vs. 6.2.1
De acceptatie van aangevoerde afvalstoffen moet per partij zintuigelijk en administratief worden gecontroleerd alvorens tot acceptatie over te gaan.
De acceptatie wordt nabij het stortfront uitgevoerd. Kennelijk heeft een medewerker toegang tot het terrein en weet aan het toezicht van de stortbeheerder te ontkomen.
- De opslagtank voor brandstof voor de shovel is gesitueerd op een betonnen plaat. Normaal is alleen deze afsluitbare tank aanwezig. Nu staat er meerdere vaatjes met olieprodukten opgeslagen. Tevens zijn enkele morsplekken aangetroffen op de betonnen plaat.
- * Vs. 9.1.5/9.1.6 e.v.
De opslag van minerale oliën en olie-afvalstoffen
Conform de vergunningaanvraag moet er op de stort een (houten, verplaatsbare) stalling aanwezig zijn. In deze stalling dient de opslag van oliën plaats te vinden.
 - * Vs. 9.2.15/9.3.8/9.3.9
De omgeving van de opslagtank moet vrij worden gehouden van brandgevaarlijke stoffen.
De omgeving van de tank moet schoon worden gehouden.
De vloer van de tankplaats moet van olie-bestendig materiaal gemaakt zijn.

Controlebezoek d.d. 8 april 1997

Tijdens het bezoek op 8 april is met 5.1.2e afgesproken dat er een plan wordt opgesteld waarin alle komende activiteiten m.b.t. het inrichten van de nieuwe stort worden opgesomd. In dat plan is dan tevens ruimte om de geurhinder en geluidshinder-aspecten, die dan kunnen ontstaan, mee te nemen. Tot op heden heb ik dat plan niet gezien/ontvangen.

Afhandelingsgegevens

- GS-brief met bestuursrechtelijke maatregelen

Ondertekening toezichthouder: [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Arnhem, 18 augustus 1997

Kopie:

- MW : archief
- PMW : [redacted] 5.1.2e

Kopie via mail:

- MW/IBM/MV : [redacted] 5.1.2e
- MW/IBM/HA : [redacted] 5.1.2e
- MW/IBM/HA : Senior TB

h:\wp\industri\bz24indu

Archief

B E Z O E K R A P P O R T

BETREFT: Stortplaats Industriewater Eerbeek B.V.

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Industriewater Eerbeek B.V.
Adres : postbus 13
Postcode : 6960 AA
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e 5.1.2e
Telefoon : 0313- 5.1.2e
Aard bedrijf : monodeponie papierafval

Datum laatste controle : 27 augustus 1997
Controledatum : 23 september 1997
Aanvang controle : 12.45 uur
Einde controle : 14.30 uur
Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	chef stortplaats medewerker	Stort Doonweg B.V. Industriewater Eerbeek

Aanleiding bezoek:

- structurele controle
- milieumeldingen nr. 259,266,273,274,279 (september) 1997

Soort controle:

- hercontrole

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- Wm-vergunning d.d. 22 februari 1996, kenmerk MW 93.35874-6093034 (inwerking getreden per 26 mei 1997)
- provincie bevoegd

Controlegegevens (algemeen)

Klachten

Direct na een telefoontje van een klaagster uit het Wilhelminapark op 23 september ben ik op pad gegaan. Bij de klaagster heb ik zowel voor als achter het huis zeer duidelijk de specifieke sliblucht waargenomen (beetje grondachtige rottende weeïge lucht). Volgens de klaagster wordt ook diverse keren per dag geclaxonneerd op de stortplaats en is gedurende de werkuren erg veel geluid waar te nemen. Tijdens het bezoek bij de klaagster is helaas net de lunchpauze begonnen en is er geen geluid van de stortplaats te horen. Het afgelopen weekend zijn eveneens diverse klachten over stank ingediend.

Stort Doonweg

Op de stortplaats is de aannemer SGT (5.1.2e en 5.1.2e) druk doende om de taluds aan te passen en andere grondwerkzaamheden uit te voeren. Daarvoor zijn tenminste drie kranen extra aanwezig

op de stortplaats (middenop stortlichaam) en tenminste twee grote vrachtwagens voor het vervoeren van zand en oude papierafvallagen.

Stank

Ik ben met 5.1.2e naar het stortfront gelopen om te bekijken wat de mogelijke oorzaak van de stankklachten kan zijn. Op het schuine talud direct langs de spoorbaan is een kraan bezig om oud papierafval weg te halen en opnieuw aan te brengen is de juiste hoek (laat het slib van enige hoogte vallen zodat de wind er goed doorheen kan waaien). Onderaan het talud heb ik in de wind geroken dat hierbij erg veel geur vrijkomt die identiek is aan de geur zoals net daarvoor bij de klaagster is waargenomen. Ook bij het ruiken aan het omgewoelde papierafval heb ik deze geur sterk waargenomen. In het afval zijn duidelijk de grote klonten slib waar te nemen. Het materiaal is redelijk vochtig, hetgeen in warm weer (tijdens controle circa 18-20 °C) al gauw kan leiden tot geurvorming.

Gelet op de windrichting en temperatuur is het vrijwel zeker dat dit de voornaamste veroorzaker is van de stankklachten.

Opmerkelijk is dat men in uitgezette vakken het talud inricht. De vakken waarin men niet aan het werk is, is het oude papierafval (inclusief klonten slib) niet afgedekt met zand/grond of ontinktingsslib).

Tijdens het bezoek heb ik geconstateerd dat oude papierafvallagen van middenop en aan de zuid-oostzijde worden afgegraven en getransporteerd (voor)langs het stortfront naar de plaats van het eerste slibdepot (n.a.v. uitspraak Raad van State), ongeveer op de oude lokatie van de nissenhut/tweede ingang stortplaats.

Ook op deze plaats wordt het oude papierafval (met klonten papierslib) niet afgedekt conform de eisen van de vergunning en de uitspraak van de Raad van State.

Over de gehele lengte van het stortfront en tientallen meters breedte is duidelijk te zien dat het in juli afgegraven oude papierafval (met slib) is verspreid en niet is afgedekt met grond of ontinktingsslib.

Tevens is nog steeds een redelijk grote poel met diepzwart bubbelend percolaatwater aanwezig op het stortfront. De drain werkt dus maar beperkt. Indien het najaar veel regenwater zal brengen verwacht ik een forse toename van het volume van deze poel. Dat water zorgt er mede voor dat het rottingsproces zal toenemen en met name bij warm weer extra geurvorming zal bevorderen.

Het metaalafval in de containers is bijna weggehaald aldus 5.1.2e. 5.1.2e Hij geeft aan dat voor hem een onbekende de fietsen heeft aangevoerd naar de stortplaats.

De wisselcontainer voor slibopvang van een pinda-pelbedrijf is

niet meer aangetroffen op de stortplaats. Volgens 5.1.2e stond deze af en toe (leeg) op de stort in afwachting van inzet bij het vervuilen en legen van de reguliere slibcontainer. Veelal stond deze wisselcontainer bij het bedrijf Noordermeer op het terrein.

Stort Doonweg/Industriewater

Na afloop van het bezoek aan de stortplaats ben ik naar het kantoor van Industriewater gereden. 5.1.2e was niet aanwezig, evenmin 5.1.2e. Ik heb met een ander lid van het management, 5.1.2e, gesproken. Ik heb hem de aangetroffen situatie uitgelegd. Daarna heb ik hem dringend geadviseerd om op zeer korte termijn actie te ondernemen t.a.v. geurbeperkende maatregelen. Ik heb hem gezegd dat het afdekken van oude papierafvallagen moet gebeuren conform de vergunning en de uitspraak van de Raad van State.

Daarnaast heb ik hem wederom mijn ongenoegen geuit over het feit dat sinds de voorbereidingen en aanvang van de werkzaamheden voor verticale uitbreiding van de stort, ik nog geen werkplanning van Stort Doonweg heb mogen ontvangen. Het is dus voor mij ondoenlijk een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden en de risico's op overlast. Ik heb 5.1.2e meegedeeld dat de uitvoering van de werkzaamheden volledig voorbij gaat aan de afspraken tussen de betrokkenen om b.v. bij bepaalde windrichtingen geen werkzaamheden die geuroverlast kunnen veroorzaken aan de zijde van het spoor uit te voeren, zeker niet in de warme periode van de zomermaanden.

Ook t.a.v. het geluid van de extra inzet van zwaar materieel wordt geen rekening gehouden met eventuele overlast.

5.1.2e zal de boodschap doorgeven aan 5.1.2e of 5.1.2e.
5.1.2e

Afhandelingsgegevens

- GS-brief met bestuursrechtelijke maatregelen

Ondertekening toezichthouder: 5.1.2e

5.1.2e Arnhem, 24 september 1997

Bijlage: : fotoreportage

Kopie:

- MW : archief
- PMW : 5.1.2e

Kopie via mail:

- MW/IBM/MV : 5.1.2e
- MW/IBM/HA : 5.1.2e
- MW/IBM/HA : Senior TB

h:\wp\industri\bz26indu



B E Z O E K R A P P O R T

BETREFT: Stortplaats Industrierwater Eerbeek B.V.

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Industrierwater Eerbeek B.V.
Adres : postbus 13
Postcode : 6960 AA
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e 5.1.2e
Telefoon : 0313- 5.1.2e
Aard bedrijf : monodeponie papierafval

Datum laatste controle : 23 september 1997
Controledatum : 10 december 1997
Aanvang controle : 9.30 uur
Einde controle : 10.30 uur
Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	senior HA	Prov. Gld.
	chef stortplaats	Stort Doonweg B.V.

(niet gesproken)

Aanleiding bezoek:

- structurele controle

Soort controle:

- hercontrole

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- Wm-vergunning d.d. 22 februari 1996, kenmerk MW 93.35874-6093034 (inwerking getreden per 26 mei 1997)
- provincie bevoegd

Controlegegevens (algemeen)

Op 9 december heb ik aan 5.1.2e door laten geven dat vandaag een controlebezoek zou plaatsvinden. De poort stond open, maar 5.1.2e was niet aanwezig.

Overdracht inrichting

In verband met de overdracht van de inrichting aan een nieuwe toezichthouder is 5.1.2e meegegaan. Zij zal voorlopig de stortplaats waarnemen totdat definitief een nieuwe toezichthouder is bepaald.

Controle

Toegangsweg

Bij aankomst is geconstateerd dat de toegangsweg nabij de inrit behoorlijk met modder en papierresten is vervuild. Zeer waarschijnlijk heeft dat nog te maken met de werkzaamheden van herinrichting van de stort.

Taluds

De taluds zijn aan alle vier zijden van het stortlichaam nu in de juiste hellingshoek aangepast. Het afdekken met geel zand is aan de spoorwegzijde grotendeels afgerond. Ook aan de zijden van industrieterrein Kollergang en het scoutingterrein is het talud afgedekt met zand. Langs de Doonweg is men nog niet zo ver. Niet op alle taluds is zwarte grond aanwezig om begroeiing mogelijk te maken (o.a. langs spoorzijde en aan scoutingzijde).

Ontwateringssysteem

Langs vrijwel de gehele oostzijde (scoutingterrein) is met folie een opvangbassin aangelegd voor het verzamelen van percolaat/hemelwater. Tevens is aan de zuidzijde van het bassin een put aanwezig waarin de aansluiting op het afvoersysteem naar de zuivering zal komen (pompput).

Rondom de stort is de eerste aanzet van de ringgoot vrijwel geheel gerealiseerd. Het is nog een open goot in de bodem. Aan de spoorwegzijde is de drain vanuit het stortfront nu beter weggewerkt. Het uitstromende percolaat stinkt overigens wel redelijk sterk (gelet op de geringe hoeveelheid water). Langs de ringgoot is al een begin gemaakt met de aanleg van een inspectieweg.

Stank

In het Wilhelminapark is geen geur waar genomen. De windrichting is westelijk en de kracht is vrij sterk (4 à 5). Op het stortfront is een grote kraan bezig met het aanleggen resp. ophogen van de stortwal. Daarbij wordt papierslibhoudend materiaal weer opgenomen en opnieuw weggezet in de wal. Het materiaal ziet er redelijk droog uit. Voor het overige is de afwerking van het slib voldoende verzorgd en is geen percolaatvijver meer aangetroffen. De geur op het stortfront van nieuw aangevoerd afval is redelijk normaal van sterkte.

Elders op de stortplaats zijn diverse groter en kleinere plassen hemelwater/percolaatwater aangetroffen. Het afdekken van papierslibhoudend afval dat bij herinrichting is verplaatst is vrijwel geheel gebeurd (op enkele kleine stukken langs Doonwegzijde na, maar daar is men nog bezig o.a. met talud).

Bij de ingang van de stort en meer richting de camping/scouting is de geur zeer duidelijk waarneembaar en hinderlijk. Ik heb geen andere werkzaamheden tussen het stortfront en de ingang waargenomen. Hierdoor concludeer ik dan ook dat de geur vrijkomt bij de werkzaamheden op het stortfront.

Aanleg tweede stortfront oostzijde

Aan de oostzijde is nu een nieuw stortdepot achter een wal aangelegd. In dit depot is al wel een geringe hoeveelheid

papierafval gestort en afgedekt met ontinktingsslib. Hiervan komt weinig geur vrij.
Tevens is een aanrijroute aangelegd met visueel redelijk schoon puin.

Geluid

Op de stortplaats zijn tijdens de controle twee kranen actief, waarvan één aan de oostzijde bij het bassin en de andere bij de stortwal aan de spoorzijde.
Daarnaast is de schovel van 5.1.2e aanwezig voor de verwerking van aangevoerd papierafval.
Tevens is nog een graafmachine aanwezig op het talud langs de Doonweg.

Containers met ijzer

Op de stort zijn de containers met oude metalen weggehaald.

Opslag olieprodukten

De dieselolietank is niet meer op de oude plek teruggevonden, wel is nabij de ingang een andere mobiele opslagtank aangetroffen. Er staan geen vaten met olie meer bij.

Afhandelingsgegevens

- GS-brief met bestuursrechtelijke maatregelen

Ondertekening toezichthouder: 5.1.2e

5.1.2e Arnhem, 10 december 1997

Bijlage: : fotoreportage

Kopie:

- MW : archief
- PMW : 5.1.2e

Kopie via mail:

- MW/IBM/MV : 5.1.2e
- MW/IBM/HA : 5.1.2e
- MW/IBM/HA : Senior TB

h:\wp\industri\bz27indu

B E Z O E K R A P P O R T

BETREFT: stort Doonweg

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Stort Doonweg B.V.
Adres : Kanaalweg 8a
Postcode : 6961 LW
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e
Telefoon : 0313 5.1.2e fax:651411
Aard bedrijf : stortplaats

Naam inrichting : Stort Doonweg
Adres : Doonweg
Plaats : Eerbeek
Contactpersoon : 5.1.2e

Datum laatste controle : 10-12-97
Controledatum : 1-4-1998
Aanvang controle : 9.00 uur
Einde controle : 12.30 uur

Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	toezichthouder	provincie Gelderland
	directeur	Stort Doonweg
	opzichter	Stort Doonweg

Aanleiding bezoek:

- Structurele controle bedrijven

Soort controle:

- Opleveringscontrole
- Preventieve integrale controle

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- WM-vergunning d.d. 22 februari 1996 MW-nr. 93.35874-6093034

Controlegegevens (algemeen)

Dit was een eerste bezoek aan de inrichting. Met 5.1.2e en 5.1.2e begonnen om de totale vergunning door te nemen. Ongeveer halverwege gekomen. Op 22 april wordt de rest doorgenomen en worden ten aanzien van de nog niet nagekomen voorschriften termijnen afgesproken. Bijgaand het verslag van het overleg. Hierna nog (kort) de stortplaats bezocht en alleen een algemene indruk kunnen krijgen. Het ziet er zeker vanaf de buitenkant netjes uit en ook geen geur waargenomen.

Afhandelingsgegevens

Vervolg van de controle op 22 april a.s.

Ondertekening toezichthouder: 5.1.2e

Arnhem, 2 april 1998

(datum + handtekening)

Kopie:

- MW : archief
- MW/IBM/PMW :
- Overige :

Kopie via mail:

- MW/IBM/MV : 5.1.2e
- MW/IBM/HA : 5.1.2e
- MW/IBM/HA : Senior TB
- Overige :

Stort Doonweg Eerbeek



Stort Doonweg Eerbeek



Stort Doonweg Eerbeek
d.d. 25 september 1997



B E Z O E K R A P P O R T

BETREFT: stort Doonweg

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Stort Doonweg B.V.
Adres : Kanaalweg 8a
Postcode : 6961 LW
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e
Telefoon : 0313 5.1.2e, fax.: 651411
Aard bedrijf : stortplaats

Naam inrichting : stort Doonweg
Adres : Doonweg
Plaats : Eerbeek
Contactpersoon : 5.1.2e

Datum laatste controle : 22-4-1998
Controledatum : 23-9-1998
Aanvang controle : 15.00 uur
Einde controle : 16.45 uur

Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	toezichthouder	provincie Gelderland
5.1.2e	opzichter	stort Doonweg

Aanleiding bezoek:

- Milieumelding, september 1996/nummer(s) 287, 299, 301

Soort controle:

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- WM-vergunning d.d. 22 februari 1996 MW-nr. 93.35874-6093034

Controlegegevens (algemeen)

Naar aanleiding van geurklachten bezoek gebracht aan inrichting. Allereerst bij klagers aan de Prinses Mariannelaan en de Louise de Collignylaan geweest en daar geroken. Klagers waren niet thuis. Er stond een zwakke oostenwind en af en toe rook ik een vleugje van de stortplaats. Vervolgens naar het Soerense zand (een zandpad aan de westelijke kant van de stort) en daar rook ik het wat sterker. Hier ontmoette ik 5.1.2e die ook de geur waarnam. Vervolgens de stortplaats bezocht. 5.1.2e deelde mee dat s'ochtends, naar aanleiding van de klachten, het stortfront verplaatst is naar het oostelijk deel. Ik kan niet beoordelen of hierdoor de geur al wat afgenomen is. Volgens 5.1.2e duurt het even voordat het effect merkbaar is.

Er lag geen slib van de afvalzuivering onbedekt. Ik vond het wel opvallend dat het ontinktinksslib, waarmee afgedekt mag worden, dezelfde geur heeft als de geur die ik in de omgeving van de stort waarneem.

Met Doonweg is afgesproken dat deze zomer een geuronderzoek uitgevoerd zou worden. Dit onderzoek heeft nog steeds niet plaatsgevonden omdat de weersomstandigheden nog niet optimaal zijn geweest. Aangezien op dit moment overlast wordt ervaren dacht ik dat het moment voor het geuronderzoek aangebroken zou zijn. 5.1.2e deelde mee dat de opdracht aan TNO is gegeven en dat zij bepalen wanneer dat moment is aangebroken (windsnelheid tussen 3 en 10 m/s, geen regenval, temperatuur minimaal 5 gr C en noordoostelijke windrichting). Met name de windrichting is een factor die er voor zorgt dat het onderzoek nog niet uitgevoerd wordt. Op het moment van het

lokatiebezoek was de windrichting oost en zal deze de komende dagen draaien naar zuidoost. Ik vrees dat de combinatie van factoren zo weinig voorkomt dat het geuronderzoek dit jaar niet uitgevoerd zal worden. Daarom wil ik bij Doonweg de onderzoeksopzet opvragen en hier laten beoordelen of het persé noodzakelijk is dat de wind precies over het Wilhelminapark waait, en of de marge niet wat ruimer kan. Aan de hand van geurcontouren moet de mate van overlast toch in beeld te brengen zijn. Ik zal hierover contact opnemen met 5.1.2e, adviseur van de Doonweg.

Afhandelingsgegevens

Bijlage

Overleg:

- MW/IBM/MV : 5.1.2e
- MW :
- Overige :

Ondertekening toezichthouder: 5.1.2e

Arnhem, 24 september 1998

5.1.2e

(datum + handtekening)

Kopie:

- MW : archief
- MW/IBM/PMW
- Overige :

Kopie via mail:

- MW/IBM/MV : 5.1.2e
- MW/IBM/HA :
- MW/IBM/HA : Senior TB
- Overige :

BEZOEKRAPPORT

BETREFT: Stort Doonweg

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Stort Doonweg B.V.
Adres : Kanaalweg 8a
Postcode : 6961 LW
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e
Telefoon : 0313- 5.1.2e
Aard bedrijf : stortplaats

Naam inrichting : stort Doonweg
Adres : Doonweg
Plaats : Eerbeek
Contactpersoon : 5.1.2e

Datum laatste controle : 23 september
Controledatum (overleg) : 7 oktober
Aanvang controle : 9.00 uur
Einde controle : 11.00 uur

Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	toezichthouder vergunningverlener adviseur Doonweg	provincie Gelderland provincie Gelderland Arcadis Heidemij

Aanleiding bezoek:

- Structurele controle bedrijven

Soort controle:

- Preventieve aspect controle

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- WM-vergunning d.d. 22 februari MW-nr. 93.35874-6093034

Controlegegevens (algemeen)

Op 1 en 22 april zijn controlebezoeken aan de Doonweg uitgevoerd en is de totale vergunning met de exploitant doorgenomen. Hoeruit vloeide een waslijst van punten waaraan de Doonweg nog moet voldoen. Dit is in een GS-brief van 13 juli jl. aan stort Doonweg meegedeeld met het verzoek om binnen drie maanden aan deze punten te werken.

Naar aanleiding van deze brief is Doonweg en Arcadis aan de slag gegaan en is over een aantal punten een reactie naar de provincie gestuurd. Tijdens dit overleg zijn die punten besproken. De overige punten die niet in het overleg aan de orde geweest zijn zullen tijdens een volgend lokatiebezoek aan de orde komen.

1. De werkinstructie (voorschrift 1.8)

Arcadis heeft alle opmerkingen van provinciezijde in de werkinstructie verwerkt. De werkinstructie zal door de directeur goedgekeurd worden.

2. Geuronderzoek (voorschrift 5.2.1)

Op 23 september heb ik een bezoek aan stort Doonweg gebracht in verband met geurklachten. Naar aanleiding hiervan heb ik telefonisch contact opgenomen met 5.1.2e om te vragen waarom er nog steeds geen geuronderzoek was uitgevoerd omdat m.i. de voorwaarden om het onderzoek uit te kunnen voeren wel voldoende aanwezig waren. 5.1.2e zou contact opnemen met TNO. Tijdens het

overleg deelde 5.1.2e mee dat afgelopen vrijdag, 2 oktober, de eerste snuffelploegmeting is uitgevoerd. Dinsdag zou een derde meting verricht moeten zijn. De resultaten zullen binnen 4 weken naar de provincie worden gestuurd.

3. Grondwatercontrolesysteem (voorschrift 7.1.6)

Het grondwaterstromingsmodel wordt nogmaals bekeken, naar aanleiding hiervan zal een voorstel voor plaatsing van peilbuizen opgesteld worden. Volgens de vergunning zouden nieuw te plaatsen peilbuizen tevens voor beheersbemaling geschikt moeten zijn. Hiervan wil Arcadis afwijken. Ik heb aangegeven dat dit bespreekbaar is. Als een verontreiniging wordt geconstateerd zal eerst een nader onderzoek noodzakelijk zijn en daarna moet de meest geschikte lokatie van een interceptieput vastgesteld worden.

4. Gasmeting (voorschrift 7.3.6)

Arcadis heeft een voorstel voor de tweejaarlijkse meting naar de provincie gestuurd. Van provinciezijde wordt aangegeven dat een kwantitatieve meting ontbreekt. Deze is wel noodzakelijk en bovendien kunnen de meetresultaten gerelateerd worden aan een eerder gemaakte prognose. Wat betreft de kwalitatieve analyse zal aangegeven worden waarom voor deze stortplaats het N₂, Co₂ en het waterdampgehalte niet van belang zijn

5.1.2e zal het voorstel aanpassen.

5. Klinkmeting (voorschrift 7.3.6)

5.1.2e overhandigt een voorstel voor de klinkmeting. Dit zal bekeken worden.

6. Overeenkomst/financiële zekerheid (voorschrift 7.3.20)

Doonweg heeft een overeenkomst tussen Stort Doonweg B.V. en de aandeelhouders toegezonden. In deze overeenkomst staat omschreven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de financiële zekerheid ten behoeve van de eindafdeling. Deze omschrijving voldoet niet aan hetgeen in het vergunningvoorschrift wordt gevraagd. Het geld dat uiteindelijk gereserveerd wordt is te laag. 5.1.2e wil aan Doonweg voorstellen om voor de 5,- die nu per ton gestorte afvalstoffen wordt gereserveerd in een bankgarantie ten behoeve van GS te stoppen (=ca. 1,5 miljoen) Het andere alternatief is dat het gereserveerde bedrag zo hoog moet zijn dat het de kosten van de bovenafdeling dekt. In het eerste geval is het bedrag lager maar de zekerheid groter.

5.1.2e zal dit schriftelijk meedelen aan Doonweg.

Verder zal 5.1.2e ook de melding betreffende de gewijzigde procedure bij de toegangspoort (voorschrift 2.4) en het verzoek om afval van Smurfit Lona te accepteren (voorschrift 6.1.3) afhandelen.

Afhandelingsgegevens

- Controlebezoek in november

Ondertekening toezichthouder: 5.1.2e

Arnhem, 7 oktober 1998

5.1.2e

(datum + handtekening)

Kopie:

- MW : archief
- MW/IBM/PMW
- Overige :

Kopie via mail:

- MW/IBM/MV : 5.1.2e
- MW/IBM/HA :
- MW/IBM/HA : Senior TB

BEZOEKRAPPORT

BETREFT: Stort Doonweg

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Stort Doonweg B.V.
Adres : Kanaalweg 8a
Postcode : 6961 LW
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e
Telefoon : 0313- 5.1.2e
Aard bedrijf : stortplaats

Naam inrichting : Stort Doonweg
Adres : Doonweg
Plaats : Eerbeek
Contactpersoon : 5.1.2e

Datum laatste controle : 1-4-1998
Controledatum : 22-4-1998
Aanvang controle : 9.00 uur
Einde controle : 12.00 uur

Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	toezichthouder	provincie Gelderland
	directeur	stort Doonweg
	opzichter	stort Doonweg

Aanleiding bezoek:

- Structurele controle bedrijven

Soort controle:

- Opleveringscontrole
- Preventieve integrale controle

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- WM-vergunning d.d. 22 februari 1996 MW-nr. 93.35874-6093034

Controlegegevens (algemeen)

Dit bezoek is een vervolg van het controlebezoek op 1 april jl. waarbij de helft van de vergunning is doorgenomen. Hieronder de naleving van de voorschriften van de andere helft van de vergunning.

Voorschrift 7.1.6: Niet zeker is of het grondwatercontrolesysteem voldoet aan de Richtlijn drainage- en controlesystemen. 5.1.2e zal de Heidemij dit uit laten zoeken. Het plan betreffende het (eventueel aan te passen) grondwatercontrolesysteem zal binnen drie maanden ter goedkeuring naar de directeur van de dienst MW gestuurd moeten worden. Voorschrift 7.4.3 omschrijft welke gegevens minimaal in het in te dienen plan moeten worden opgenomen. Het controlesysteem voor de controle op stagnant water moet in het goed te keuren monitoringsplan meegenomen worden.

Voorschrift 7.1.11 (7): De verzamelleidingen en de afvoersloten van het percolaat dienen vloeistofdicht te zijn uitgevoerd. Dit blijkt niet het geval te zijn. Alleen aan de zijde waar het percolaat wordt gebufferd is vloeistofdicht met een folie uitgevoerd.

Ik heb meegedeeld dat dit aangepast moet worden. 5.1.2e stelde voor om het percolaat te bemonsteren omdat hij van mening is dat het water schoon is. Hij wil een monster in de natte periode en een in de droge periode nemen. Ik heb hiermee ingestemd, maar aangegeven dat een lichte verhoging van de CZV al voldoende is om de gehele sloot vloeistofdicht uit te voeren. Voorschrift

7.1.9 ondersteunt dit: "Verontreinigende stoffen mogen zich niet uit de gestorte afvalstoffen in de bodem verspreiden."

Voorschrift 7.1.19: Het beplantingsplan is nog niet goedgekeurd en zal op korte termijn opgestuurd worden (Half mei ontvangen).

Voorschrift 7.2.6: Volgens dit voorschrift is het afdekken met ~~slib~~ ^{Residu (= o.v.-slib)} niet toegestaan, terwijl dit wel gebeurt. De Doonweg heeft ca 2 jaar geleden onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van slib als afdek materiaal en hieruit blijkt dat afdekken met slib inmiddels wel mogelijk is. De rapportage van dit onderzoek is naar de provincie gestuurd. Ik zal met **5.1.2e** overleggen of dit klopt en als dit zo is dan kan hiervan een melding worden gedaan.

Voorschrift 7.2.9 Volgens dit voorschrift moeten maatregelen genomen worden om het ontstaan van zwerfvuul te voorkomen. Er is een verplaatsbaar hek aanwezig geweest. Tijdens de herinrichtingswerkzaamheden is dit hek opgeruimd. Als het noodzakelijk is zal het hekwerk weer geplaatst worden.

7.3 Dichte eindafwerking: Arcadis voert op dit moment een onderzoek uit naar alternatieve mogelijkheden voor een dicht eindafwerking. In het 2e kwartaal van dit jaar komt Arcadis met de eerste bevindingen. De eindafdichting hoeft volgens de vergunning voorlopig nog niet aangebracht te worden.

Voorschrift 7.3.6 gasvorming en klink moeten resp 2 keer en 4 keer per jaar gemeten worden. Op dit moment gebeurt dit nog niet en dit is ook niet in de werkinstructie opgenomen. **5.1.2e** zal aan Arcadis vragen een voorstel te doen hoe, waar en wanneer het beste gemeten kan worden.

Voorschrift 7.3.20: Financiële zekerheid: Doonweg en Arcadis zijn nog met elkaar in overleg over de vorm waarin de zekerheid wordt gegeven. In het tweede kwartaal van dit jaar zal hierover bericht worden.

Voorschrift 7.4.4 De grondwaterstanden worden 1 keer per maand opgenomen in plaats van de voorgeschreven frequentie van 2 keer per maand. Dit in verband met de geringe fluctuaties. In het jaarverslag van 1998 worden geen grondwaterstanden gerapporteerd. In het nog in te dienen monitoringsplan kan een lagere frequentie met een motivatie voorgesteld worden.

Voorschrift 7.5.1 Alle onderhouds- en controlewerkzaamheden moeten volgens dit voorschrift worden vastgelegd in een plan. Volgens een brief van 19 december 1997 Van Arcadis namens Doonweg zou dit plan in de werkinstructie opgenomen worden, maar dit is niet gebeurd.

Geleidebrieven: SCA de Hoop wil geen geleidebrieven gaan meevoeren, maar wegen en registratie ter plaatse bij het bedrijf uitvoeren. Afgesproken is dat ik dit intern (bij **5.1.2e**) zal voorleggen.

Geconstateerde overtredingen

- Overtreden vergunningvoorschriften:
zie boven. Alle punten zal binnen 3 maanden actie ondernomen worden

Afhandelingsgegevens

- Brief betreffende het bezoek van 1 april en dit bezoek en hercontrole

Overleg:

- MW/IBM/MV : **5.1.2e**

Ondertekening toezichthouder: **5.1.2e**

Arnhem, 3 juni 1998

5.1.2e

ng)

Kopie:

- MW : archief
- MW/IBM/PMW
- MW/IBM/MV : **5.1.2e**
- MW/IBM/HA : Senior TB

B E Z O E K R A P P O R T

BETREFT: Stort Doonweg

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Stort Doonweg B.V.
Adres : Kanaalweg 8a
Postcode : 6961 LW
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e
Telefoon : 0313- 5.1.2e
Aard bedrijf : stortplaats

Naam inrichting : stort Doonweg
Adres : Doonweg
Plaats : Eerbeek

Datum laatste overleg : 7 oktober 1998
overlegdatum : 24 februari 1999
Aanvang overleg : 14.00 uur
Einde overleg : 17.00 uur

Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	toezichthouder	provincie Gelderland
	vergunningverlener	provincie Gelderland
	adviseur Doonweg	Arcadis
	adviseur Doonweg	Arcadis

Aanleiding bezoek:

- Structurele controle bedrijven

Soort controle:

- Preventieve aspect controle

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- WM-vergunning d.d. 22 februari 1996 MW-nr. 93.35874-6093034

Controlegegevens (algemeen)

Overleg vond plaats naar aanleiding van enkele toegezonden rapporten. Daarnaast zijn enkele lopende zaken besproken.

1. Stortgasmeting

Arcadis heeft Promonitoring een kwaliteitsonderzoek laten verrichten naar het vrijkomend stortgas op de Doonweg. Uit dit kwaliteitsonderzoek blijkt dat de gehalten aan CH₄ en H₂S op de verschillende meetpunten nogal varieert. De vervolgstap is dat er nu regelmatig kwantiteitsonderzoek moet gaan plaatsvinden. De vergunning schrijft 2 keer per jaar voor. Tijdens het overleg is enige tijd gediscussieerd over het nut en de gebruikswaarde van de resultaten van dergelijke kwantiteitsonderzoeken. Volgens de Leidraad Storten is het doel van dergelijke metingen om de gasontwikkeling in de afwerk- en nazorgsfase in te schatten zodat een op de situatie afgestemde gasonttrekking gerealiseerd kan worden. 5.1.2e zegt dat deze informatie het beste verzameld kan worden na beëindiging van de stortactiviteiten. Op dat moment worden 1 of meerdere bronnen geplaatst, fakkels huren en meten welke voorziening noodzakelijk is.

In 1996 heeft TNO een prognose gemaakt van de hoeveelheid stortgas die op de Doonweg vrijkomt. Volgens TNO zou de top van de stortgasproductie in het jaar 2000 liggen en dat de hoeveelheid 300-500 m³ per uur zou zijn. Omdat de Doonweg door de aard en samenstelling van het stortmateriaal 4 keer zoveel bronnen moet plaatsen als bij een gemiddelde stortplaats is ook de winning van

dit gas duurder (Doonweg f0,30-f0,70, gem. stortplaats f0,10) 5.1.2e spreekt zijn hoop uit dat de provincie bij de besluitvorming of een installatie moet worden aangelegd rekening houdt met de hoge prijs die hiervoor betaald moet worden.

De prognose van TNO is niet gebaseerd op metingen. Daarom is het zinvol om te bekijken aan de hand van een meting of de prognose ook klopt en of de conclusies die hieruit volgen nog juist zijn. Dus enkele kwantiteitsmetingen zijn zinvol. Als uitgegaan wordt van de vergunningvoorschriften zijn gedurende 2 jaar 2 metingen vereist.

2. Geuronderzoek

Arcadis heeft eind vorig jaar de rapportage van de snuffelploegmetingen toegezonden. De bedoeling was om de resultaten nu te bespreken, maar 5.1.2e 5.1.2e die het rapport van 5.1.2e kreeg heeft er nog niet naar kunnen kijken. Er moet nog een "nul-onderzoek" uitgevoerd worden (=een meting als de stortplaats niet in bedrijf is. In het weekend). 5.1.2e vraagt zich af wat de zin van een nul-meting is. Deze vraag heb ik voorgelegd aan 5.1.2e. Hij zegt dat de omwonenden om een dergelijke meting hebben gevraagd. Omdat de ideale weersomstandigheden zich in het weekend nog steeds niet hebben voorgedaan is deze meting nog niet uitgevoerd. Het rapport kan wel alvast beoordeeld worden omdat als de norm op werkdagen niet overschreden wordt, zal dit in het weekend zeker niet het geval zijn.

3. Onderzoek afdichtingsconstructie

De vergunning van de Doonweg biedt de mogelijkheid om een alternatieve bovenafdichtingsconstructie aan te brengen. Vereist wordt dat de dichte eindafdichting ten minste het beschermingsniveau biedt die gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau van de bodem dat is beoogd in de Richtlijn dichte eindafwerking.

Het begrip "beschermingsniveau" is in dit kader al eerder met de provincie besproken. Hieruit is geconcludeerd dat de bovenafdichtingsconstructie niet aan bijvoorbeeld de doorlatendheidseisen hoeft te voldoen, maar dat wat uiteindelijk onder de stort in de bodem en het grondwater kan geraken minimaal aan de eisen van een normale IBC-stort moet voldoen. Dus de gehele stort Doonweg moet dan als een systeem worden gezien waarin de flux, de hoeveelheid percolaat die netto uit de stort treedt, maximaal 5mm/jaar is en een gemiddelde vuillast bevat. Omdat de stort minder verontreinigende stoffen bevat en erg compact (minder doorlatend) is zouden concessies aan de bovenafdichting kunnen worden gedaan.

Arcadis heeft in opdracht van Doonweg een onderzoek verricht naar de mogelijkheid om papierslib als afdichtingsmateriaal te gebruiken. Het onderzoek is nog niet volledig maar Arcadis had de behoefte om de bevindingen tot nu toe te bespreken en om te bezien of het onderzoek voortgezet kan worden.

Tot nu toe zijn de bevindingen als volgt.

Doorlatendheid van het slib is erg hoog, ook bij optimale verdichting nog onvoldoende. In ieder geval kan met alleen slib als afdichting niet worden volstaan. Er is nog te veel onzekerheid over het uitlooggedrag van de gestorte afvalstoffen. Ontkinkingsslib is inmiddels wel onderzocht maar de resultaten zijn nog niet in het rapport verwerkt. 5.1.2e 5.1.2e deelt mee dat het EOX-gehalte hoog is. Van de overige 2 afvalstromen die gestort worden zijn nog geen uitloogproeven gedaan. Deze informatie is wel nodig om uit te kunnen rekenen wat de te verwachten vuillast die als percolaat vrij zal komen.

Verder bestaat er veel onzekerheid over de duurzaamheid van slib als afdichtingsmateriaal. 5.1.2e 5.1.2e deelt mee dat bij een diepe ontgraving in een vergelijkbare stortplaats in Eerbeek het slib zo goed als onveranderd eruit zag. Arcadis stelt dat afbraak nauwelijks plaatsvindt.

Vaststaat dat op dit moment nog te veel onduidelijkheden bestaan om te kunnen beslissen of er perspectief zit in het toepassen van papierslib als onderdeel van een afdichtingsconstructie.

Afgesproken is het volgende:

- 5.1.2e 5.1.2e legt Doonweg voor dat indien slib als afdichting gebruikt gaat worden vrijwel zeker een folie nodig is om aan een lagere doorlatendheid te komen. Het is belangrijk dat Stort Doonweg zich dit realiseert, want ook het

verdere onderzoek naar de geschiktheid van het slib als afdichtingsmateriaal zal nog wat geld kosten

-Het rapport zal aangevuld worden met uitlooguitkomsten van alle stoffen die op de Doonweg gestort worden.

-Het percolatiewater zoals dat nu uit de stort komt zal op samenstelling onderzocht worden, de resultaten van de bemonsteringen van de afgelopen jaren van de peilbuizen zullen meegenomen worden in het rapport. Al deze gegevens geven een beeld van de vuillast die de stort kan veroorzaken naar de ondergrond.

-In het rapport worden verschillende varianten met elkaar vergeleken. Hierbij staan nog enkele onvolkomenheden. Daarnaast zal meer aandacht besteed worden aan duurzaamheid.

5.1.2e suggereert dat eventuele risico's verrekend kunnen worden in het nazorgfonds.

Ik heb hier niet zo'n hoge verwachting van want er is slechts 16 miljoen beschikbaar (eindafwerking en nazorg en ontgassing) en dit is volgens Doonweg een doemscenario.

Bovenstaande aanvullingen op de rapportage is noodzakelijk om van onze zijde te kunnen beslissen of het zinvol is om het onderzoek verder voort te zetten. (De kans bestaat ook dat Doonweg beslist om onderzoek naar dit alternatief stop te zetten omdat vermeende voordelen niet gehaald worden).

Afgesproken is verder dat het overleg over dit onderwerp voortgezet wordt zodra de rapportage is aangepast.

Er lagen nog enkele overlegpunten, maar deze zijn gezien het tijdstip van de dag verzet naar 24 maart a.s.

Op de agenda staat dan:

- Geuronderzoek
- monitoringsplan grondwater
- voorstel stortgasmonitoring
- indien gereed het aangepaste slibonderzoek

Afhandelingsgegevens

- overleg op 24 maart

Ondertekening toezichthouder: 5.1.2e

Arnhem, 4 maart 1999

(datum + handtekening)

Kopie:

- MW : archief
- MW/I/CPK
- Overige :

Kopie via mail:

- MW/IBM/MV : 5.1.2e
- MW/IBM/HA :
- MW/IBM/HA : Senior TB
- Overige :

B E Z O E K R A P P O R T

BETREFT: Stort Doonweg

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Stort Doonweg B.V.
Adres : Kanaalweg 8a
Postcode : 6961LW
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e
Telefoon : 0313 5.1.2e
Aard bedrijf : stortplaats

Naam inrichting : stort Doonweg
Adres : Doonweg
Plaats : Eerbeek

Datum laatste controle : 24 februari 1999
Controledatum : 17 maart 1999
Aanvang controle : 14.00 uur
Einde controle : 16.30 uur

Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	toezichthouder vergunningverlener directeur	provincie Gelderland provincie Gelderland Stort Doonweg

Aanleiding bezoek:

- Structurele controle bedrijven

Soort controle:

- Hercontrole en preventieve aspecten controle

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- WM-vergunning d.d. 22 februari 1996 MW-nr. 93.35874-6093034
- Provincie bevoegd gezag

Controlegegevens (algemeen)

Dit bezoek was een hercontrole op een de GS-brief van 13 juli 1998, nr. MW98.24126-6095035. Een aantal punten uit die brief zijn de afgelopen maanden in besprekingen met Arcadis aan de orde geweest (zoals eindafwerking, monitoring, gasmetingen, geuronderzoek). De overige punten uit de GS-brief zijn besproken met 5.1.2e en ter plekke op de stort gecontroleerd.

Voorschrift 2.3:

Het bord bij de ingang is aangepast, conform voorschrift.

Voorschrift 2.4:

In GS-brief van 17 november 1998, nr. MW93.35874, is akkoord gegaan met de veranderde werkwijze bij de toegangspoort (geen camera-inspectie meer, alleen de leveranciers van afval kunnen de poort openen).

Voorschrift 2.7

Het hekwerk zou in orde worden gemaakt zodra de graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het percolatiewatersysteem beëindigd zijn. Op moment van controle moest het gat dat dienst heeft gedaan als bufferopvang van percolatiewater nog gedicht worden. In april/mei zal het hekwerk definitief aangepast worden. Tussentijds hebben wel reparaties van het oude hekwerk plaatsgevonden.

Voorschrift 2.8

Het schoonhouden van de toegangsweg is opgenomen in de werkinstructie.

Voorschrift 2.12

Tijdens de controle op de stort blijkt dat de dieselolietank niet beveiligd is

tegen aanrijdingen.

Dit was tijdens mijn vorige bezoek wel het geval. Uit navraag bij de stortbaas blijkt dat hij de beschermende betonblokken net verwijderd heeft uit allerlei praktische overwegingen. Afgesproken is dat de stortbaas zal zorgdragen voor een nieuwe (werkbare) vorm van beveiliging of verplaatsing van de tank.

Voorschrift 3

De blusmiddelen zijn in bestelling, door de ziekte van [5.1.2e] is dit blijven liggen. [5.1.2e] verwacht de blusmiddelen binnen enkele weken.

Voorschrift 4.2.2

Het geluidsonderzoek is door ons beoordeeld. In GS-brief van 10 juli nr. MW98.32315-6095035 wordt gesteld dat, behoudens enkele kanttekeningen, voldaan wordt aan de vergunningvoorschriften. De kanttekeningen hebben betrekking op enkele punten in de uitvoering waarmee bij een volgend onderzoek rekening gehouden moet worden.

Voorschrift 5.3

De maatregelen tegen stofhinder zijn in de werkinstructie opgenomen.

Voorschrift 5.2.1

Het geuronderzoek heeft plaatsgevonden. De resultaten liggen nu ter beoordeling bij [5.1.2e]. Er ontbreekt nog een nul-onderzoek. Dit is een meting op het moment dat er niet gewerkt wordt (zondag) en is op verzoek van de omwonenden in de onderzoeksopzet meegenomen. Deze nulmeting kan pas verricht worden als de weersomstandigheden aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zonder deze meting kan het geuronderzoek wel al beoordeeld worden.

Voorschrift 6.3.1

Vorig jaar is Doonweg met geleidebrieven per vracht gaan werken. SCA De Hoop wilde niet aan deze verplichting meewerken en heeft de provincie verzocht om een vereenvoudigde uitvoering van de regelgeving. Na overleg met SCA-de hoop heeft SCA van GS toestemming gekregen om één universeel geleidebiljet te gebruiken. [5.1.2e] vindt dit een zeer aantrekkelijke optie voor het slib van Industriewater en wil dit ook graag voor deze afvalstroom. Hij zal een schriftelijk verzoek indienen. Dit verzoek is op 19 maart binnengekomen.

Voorschrift 6.3.2

Afgesproken was dat geconstateerde afwijkingen bij inspecties, of afwijkende partijen afval en de onderhoudswerkzaamheden geregistreerd zouden worden in een logboek. Het logboek is er gekomen. Het bijhouden ligt een stuk moeilijker. [5.1.2e] heeft tot dat hij met ziekteverlof ging goed geregistreerd. [5.1.2e], die voornamelijk shovelmachinist is heeft hier duidelijk meer moeite mee. Onderhoudswerkzaamheden van pompputten en repaties vindt hij zo vanzelfsprekende werkzaamheden en de zin van het registreren van bevindingen en/of afwijkingen ziet hij absoluut niet. Bij een volgend bezoek zal ik hier nogmaals aandacht aan besteden en bekijken welke informatie absoluut niet mag ontbreken in het logboek.

Voorschrift 6.3.3 en 6.3.4

Er is nog steeds geen vakindeling. Moet er toch komen.

Voorschrift 7.1.6

Arcadis heeft een plan opgesteld voor een aanpassing van het grondwatercontrolesysteem. Dit plan wordt eind deze maand besproken.

Voorschrift 7.1.11 (7)

Afgesproken was dat monsters zouden worden genomen van het water uit de sloot. Dit is gebeurd. [5.1.2e] heeft me de analyseresultaten overhandigd. Afgesproken is dat ik deze eerst zal bekijken, de bevindingen telefonisch bespreek en dan ook het standpunt van de provincie aangeef welke maatregelen op welke termijn genomen moeten worden wat dan in GS-brief bevestigd zal worden.

Voorschrift 7.1.19

Het beplantingsplan dat Doonweg vorig jaar heeft ingediend is door RWG beoordeeld en met opmerkingen hierover in een GS-brief van 3 september nr. MW93.35874-6093034 aan Doonweg gezonden.

Voorschrift 7.2.6 Het dagelijks afdekken van het stortfront met ontinktinksslib, wat in de vergunning verboden is, blijkt inderdaad 2 jaar geleden toestemming voor verleend te zijn middels een melding. (op 20-12-1996 gemeld aan de hand van onderzoek van Heidemij/Imd, projectnr. 43064 nov.'96).

Voorschrift 7.3.6

Klinkmeting: Arcadis heeft voorstel ingediend. Is besproken en goedgevonden. Moet nog schriftelijk bevestigd worden.

Gasmeting: Dit voorstel is nog onderwerp van bespreking met Arcadis. Een kwalitatief onderzoek is uitgevoerd. In discussie is nog hoe de kwantitatieve meting moet plaatsvinden.

Voorschrift 7.3.20

De vergunning stelt dat moet worden zorggedragen voor een financiële zekerheid. De berekening van het bedrag moet gebaseerd zijn op een bovenafdichtingsconstructie van zand-bentoniet en folie volgens de Richtlijn en alle bijbehorende voorzieningen. In een overeenkomst met de aandeelhouders wordt uitgegaan van 5,- per ton gestorte afvalstoffen. Het bedrag dat hieruit voortkomt zal lang niet dekkend zijn. Daarnaast wil Doonweg geen bankgarantie afgeven. In een GS-brief van 17 november 1998 is gesteld dat wij akkoord gaan met 5,- per ton als daar ook een bankgarantie wordt afgegeven. (Dit bedrag mag volgens Stortbesluit maximaal gevraagd worden. Tijdens het controlebezoek vertelt 5.1.2e dat het bedrag dat gereserveerd wordt voor de eindafwerking samenhangt met het bedrag dat voor de nazorg gevraagd gaat worden. De mening van de provincie en de Doonweg liggen op dit laatste punt sterk uiteen (Doonweg rekent op 2 miljoen nazorg en de provincie gaat uit van 7 miljoen). Wat aan nazorg meer besteed wordt gaat van de reservering voor eindafwerking af. 5.1.2e en ik houden contact over deze kwestie.

Voorschrift 7.4.4

De door Doonweg voorgestelde lagere frequentie van grondwaterstandsmetingen zal in de beoordeling van het monitoringsplan meegenomen worden.

Voorschrift 7.5.1

Een schema van onderhouds- en controlewerkzaamheden is in de werkinstructie opgenomen.

Voorschrift 9

Op de stort staat een metalen hokje waar olie- en smeermiddelen worden opgeslagen. De lekbakken rondom de vaten is veel te klein. Afgesproken is dat aan het hok een opstaande rand gelast zal worden zodat het ergste voorkomen kan worden.

Tot slot is nog gevraagd om de stortgegevens van 1998. Per maand de gegevens van de verschillende ontdoeners, inclusief puin. Dit zal worden toegezonden naast het jaarverslag dat binnenkort gereed is.

Verder heeft 5.1.2e nog gevraagd naar de metingen van de meetdienst. Ik zal deze eerst bekijken en toesturen. Verder zal ik nog een berekening van de restcapaciteit laten maken.

Geconstateerde overtredingen

- Overtreden vergunningvoorschriften:
2.12, 6.3.3/6.3.4, 7.1.11 (7), 9

- Overtreden wetsartikelen:

Afhandelingsgegevens

- Brief en hercontrole

Ondertekening toezichthouder: 5.1.2e

Arnhem, 6 april 1999

(datum + handtekening)

Kopie:

- MW : archief
- MW/1/CPK

Kopie via mail:

- MW/IBM/MV : 5.1.2e
- MW/IBM/HA : 5.1.2e
- MW/IBM/HA : Senior TB

mw. Archie/

B E Z O E K R A P P O R T

BETREFT: Stort Doonweg

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Stort Doonweg B.V.
Adres : Kanaalweg 8a
Postcode : 6961LW
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e
Telefoon : 0313- 5.1.2e
Aard bedrijf : stortplaats

Naam inrichting : stort Doonweg
Adres : Doonweg
Plaats : Eerbeek

Datum laatste controle : 17 maart 1999
Controledatum : 8 juli 1999 (overleg)
Aanvang controle : 9.00 uur
Einde controle : 12.30 uur

Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	toezichthouder	provincie Gelderland
	vergunningverlener	provincie Gelderland
	beleidsmedewerker	provincie Gelderland
	adviseur Doonweg	Arcadis
	adviseur Doonweg	Arcadis

Aanleiding bezoek:

- Overleg

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- WM-vergunning d.d. 22 februari 1996 MW-nr. 93.35874-6093034
- Provincie bevoegd gezag

Controlegegevens (algemeen)

Dit overleg was een vervolg op een overleg dat op 24 februari 1999 plaatsvond naar aanleiding van de volgende punten:

1. Geuronderzoek
2. stortgasmetingen
3. monitoringsplan
4. slib als eindafsluiting

1. Geuronderzoek

5.1.2e heeft de rapportage van het tot nu toe uitgevoerde onderzoek becommentarieerd. Dit commentaar is een week geleden naar 5.1.2e gemaild. Hij zal dit doorgeven aan TNO die het onderzoek heeft uitgevoerd. Het commentaar zal verwerkt worden in de eindrapportage. Als er nog vragen zijn zullen die rechtstreeks aan 5.1.2e gesteld worden. Het geuronderzoek buiten werktijden zou in het weekend van 10 en 11 juli uitgevoerd kunnen worden omdat de weersomstandigheden "gunstig" zijn. 5.1.2e zal TNO hierom vragen. Inmiddels zijn er weer enkele geurklachten binnen gekomen. Op 12 juli heb ik telefonisch contact opgenomen met de Doonweg en begrepen dat het geuronderzoek afgelopen weekend niet is uitgevoerd. Althans de directeur van Industrierwater was hiervan niet op de hoogte. De geurklachten die nu binnenkomen hebben zeer waarschijnlijk te maken met de hoge temperatuur en de windrichting.

2. Stortgasmetingen

Arcadis heeft een nieuw onderzoeksvoorstel gemaakt om stapsgewijs meer inzicht te krijgen in de kwaliteit en kwantiteit van de stortgasproductie en -emissie. Het doel van dit onderzoek is om voordat het storten is beëindigd inzicht te hebben in de gewenste maatregelen en de bijbehorende kosten. De eerste stap bestaat uit een kwalitatieve meting van het gas op verschillende punten in de bovenste halve meter van de stort. Tegelijkertijd worden 8 filters in de schijnwaterspiegel van de stort geplaatst waarmee een semikwantitatieve meting uitgevoerd kan worden. Aan de hand van de resultaten van stap 1 kan geconcludeerd worden of sprake is van emissie en de omvang van de productie. Als deze voldoende hoog is wordt besloten tot stap 2 en wordt een proefonttrekking uitgevoerd.

Dit voorstel moet nog met Doonweg besproken worden. Indien Doonweg akkoord gaat zal dit plan de komende 2 weken ter beoordeling naar de provincie gestuurd worden. Omdat de metingen het best in de zomerperiode uitgevoerd kunnen worden zal ook het oordeel van de provincie voor 25 juli klaar moeten zijn. In het voorstel komt een evaluatie-moment waarbij de provincie betrokken wordt bij eventuele bijstelling of verfijning van het onderzoek en het eventuele vervolg van het onderzoek in stap 2.

3. Monitoringsplan grondwater

Het commentaar op het ingediende plan is besproken. Het gaat hierbij om:

- de lokatie van de peilbuizen: het plan maakt niet duidelijk hoe tot de afstanden tussen de peilbuizen is gekomen. Welke gegevens zijn in een eventueel gebruikt computermodel ingevoerd, zoals bijvoorbeeld monitoringszone, afstand filters tot de stort, controlegrens, gidsstoffen.
- lokale grondwaterstanden ontbreken
- motivatie voor een beperkter analysepakket

Het monitoringsplan zal zo spoedig mogelijk op deze punten bijgesteld worden.

4. Slib als bovenafdichting

In vervolg op eerder overleg stond nu de vraag centraal of met het gebruik van ontinktinksslib als enkelvoudige bovenafdichting het beschermingsniveau dat beoogd is in het Stortbesluit gehaald kan worden. Vaststaat dat een dergelijke bovenafdichting nooit de lage doorlatendheid van zand-bentoniet kan halen, maar omdat de aard van de afvalstoffen en het uitlooggedrag anders is dan bij een normale stortplaats zou het eventueel kunnen dat de vuillast van het uittredend percolatiewater overeenkomt met een normale stortplaats die alle voorzieningen heeft. Om dit te kunnen onderzoeken heeft Arcadis uitloogproeven gedaan van de 3 afvalstoffen die gestort zijn en worden in een gelijke verhouding als die op de stort aanwezig zijn (ca. 1:1:1). Aan de hand hiervan is de emissie berekend. Uit deze berekening blijkt dat de emissie toch groter zal zijn dan bij een worst-case stortplaats (=een stortplaats waarbij ook huisvuil e.d. is gestort). Geconcludeerd kan worden dat in ieder geval een combinatie-afdichting nodig is zodat de doorlatendheid afneemt.

Een zeer kwetsbaar punt in het onderzoek is de duurzaamheid van het slib als eindafdichtingslaag. Hierover is zo goed als niets bekend en zal in het vervolg van het onderzoek aandacht besteed gaan worden. Aangezien dit vervolg kostbaar en tijdrovend is wil Arcadis weten of zowel provincie als Doonweg de conclusies onderschrijven. Voor de provincie ligt het vast dat het beschermingsniveau van het Stortbesluit gehaald moet worden, dat een combinatieafdichting in ieder geval noodzakelijk is, maar dat de duurzaamheid eveneens een bepalend aspect is of uiteindelijk het slib toegepast mag worden. De vraag is nog of de Doonweg naar aanleiding van de uitkomsten van het voorliggende rapport door wil gaan met een duurzaamheidsonderzoek. Arcadis zal de uitloogonderzoeken de berekeningen en de conclusies nog in de rapportage verwerken.

Tijdens het overleg bleek nog dat een van de 2 puilbuizen in de stort niet meer functioneert. Dit zal ik tijdens controlebezoek op 22 juli meenemen.

Ondertekening toezichthouder: 5.1.2e

Arnhem, 6 april 1999

(datum + handtekening)

Kopie:

- MW : archief
- MW/I/CPK

Kopie via mail:

- MW/AV : 5.1.2e
- MW/AV : 5.1.2e
- Senior TB

BEZOEKRAPPORT

BETREFT: Stort Doonweg

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Stort Doonweg B.V.
Adres : Kanaalweg 8a
Postcode : 6961LW
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e
Telefoon : 0313 5.1.2e
Aard bedrijf : stortplaats

Naam inrichting : stort Doonweg
Adres : Doonweg
Plaats : Eerbeek

Datum laatste controle : 8 juli 1999 (overleg)
Controledatum : 22 juli 1999
Aanvang controle : 9.00 uur
Einde controle : 11.30 uur

Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	toezichthouder directeur	provincie Gelderland Stort Doonweg

Aanleiding bezoek:

- Structurele controle bedrijven

Soort controle:

- Hercontrole en preventieve aspecten controle

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- WM-vergunning d.d. 22 februari 1996 MW-nr. 93.35874-6093034
- Provincie bevoegd gezag

Controlegegevens (algemeen)

De stort heeft een nieuwe directeur, daarom eerder een controlebezoek gepland i.v.m. kennismaking en bespreking lopende zaken.

De laatste handhavingsbrief d.d. 18 mei 1999 is doorgenomen en op de stortplaats heeft een hercontrole van de in deze brief genoemde punten plaatsgevonden.

- Hekwerk

is nog niet gerepareerd. De plekken waar een deugdelijk hekwerk ontbreekt zijn verplaatsbare hekwerken neergezet. Aanvragen voor offertes voor herstel van het hekwerk zijn onderweg.

- Beveiliging dieselolietank: de tank is verplaatst zodanig dat de afstand tussen aanrijroute en tank groter dan 2 meter is.

- Blusmiddelen zijn binnen de inrichting aanwezig. Afgesproken is dat deze worden opgehangen in de ruimte bij het toegangshek.

- Vakindeling voor de stortplaats zal na de bouwvakvakantie gemaakt worden en eind augustus naar mij toegezonden worden. Hierna zal ook de registratie conform voorschrift plaats vinden.

- Opslag olie en smeermiddelen. Het hok was netjes opgeruimd. Er staan geen vaten meer buiten de opvangbakken.

-Vloeistofdichte percolatiesloot.

Tot mijn grote verbazing is de sloot zonder gebruik te hoeven maken van handhavingsmiddelen vloeistofdicht gemaakt met folie. De termijn in de brief was 1 oktober 1999. Een minpuntje was dat Doonweg niet vooraf contact heeft opgenomen met mij en de bewonersvereniging, omdat de werkzaamheden overlast kunnen veroorzaken. Er is ook een klacht over geluidsoverlast bij het MKIC binnengekomen. 5.1.2e betreurde dit ook, maar hij was in de veronderstelling dat zijn voorganger 5.1.2e hier al het nodige aan had gedaan. Naar aanleiding van de klacht heeft hij onmiddellijk de bewonersvereniging uitgenodigd voor kennismaking en toelichting op de werkzaamheden.

Geur: Er moet nog steeds een geurmeting buiten kantooruren plaatsvinden. De omstandigheden waaronder deze meting moeten plaats vinden komen zeer zelden voor. Met name de nooroostelijke windrichting is hier debet aan. Er vindt nu overleg plaats met TNO of die windrichting iets ruimer genomen kan worden zodat dit onderzoek eens afgesloten kan worden. Want ook bij oostenwind is een klacht over geuroverlast bij het MKIC binnengekomen. Tot nu toe zijn er dit jaar slechts 3 geurklachten binnengekomen. Mogelijk is de situatie op Doonweg aanzienlijk verbeterd.

-Stortgasmetingen; Tijdens het overleg met Arcadis was afgesproken dat een concept-voorstel, nadat het aan Doonweg was voorgelegd, voor 25 juli naar de provincie gestuurd zou worden. 5.1.2e deelt mee dat Doonweg nog enkele vragen n.a.v. dit voorstel had en de persoon bij Arcadis die deze vragen moet beantwoorden is op vakantie. Pas als Doonweg accoord gaat met het voorstel wordt het naar de provincie gestuurd, dus dat wordt augustus.

Monitoringsplan: dit plan ligt voor enkele aanvullingen bij Arcadis. Naar aanleiding hiervan heb ik meegedeeld dat 1 puilbuis van hetstagnante water in de stortplaats waarschijnlijk niet meer functioneert omdat ik daar geen gegevens van heb ontvangen. Ik heb meegedeeld dat dit onderdeel vormt van het monitoringsplan en dat deze weer hersteld moet worden. Dit kan tegelijk met de plaatsing van de overige aanvullende peilbuizen van het meetnet nadat dit plan door GS is goedgekeurd.

Jaarrapportage 1998: Het overzicht in dit rapport betreffende de verschillende stromen van de verschillende bedrijven is niet duidelijk. Ook op enkele analysestaten van de 2 jaarlijkse bemonsteringen van de afvalstromen is niet altijd duidelijk aangegeven om welke stroom het gaat. 5.1.2e zegt toe dat hij de juiste informatie zal toesturen.

- Verder nog gesproken over de voortgang van de toekomstige slibverbranding in Duiven. 5.1.2e verwacht dat de kans zeer groot is dat deze installatie op 1-1-2001 niet operationeel is. Op dat moment moet de stortplaats dicht. Ik heb aangegeven dat nu al nagedacht moet gaan worden over alternatieve verwijdering. Een mogelijkheid is om tijdig een wijziging van de vergunning aan te vragen, maar de kans is zeer groot dat omwonenden alles zullen aangrijpen om verlenging van de vergunning tegen te gaan. 5.1.2e oppert gedogen, maar hiervan heb ik aangegeven dat dit niet kan. Er is geen sprake van noodsituatie, want zeker een jaar van te voren kan ingeschat worden dat de installatie niet tijdig operationeel is, dus de geëigende weg via een vergunningprocedure is noodzakelijk, maar de kans dat dit een succesvolle weg is, is gering. Ik heb meegedeeld dat de kans groot is dat de provincie van mening is dat het papierslib voor de periode tussen 1-1-2001 en het operationeel worden van de CDEM-installatie naar de regionale stort moet. Dit zal bij de papierindustrie op zeer grote bezwaren stuiten in verband met de hoge kosten. Een reden te meer om geen onnodig tijd te verliezen in de vergunningprocedure.

- Capaciteit stortplaats.

Volgens voorschrift 6.1.4 van de vergunning mag er afval gestort worden tot 14,5 meter boven maaiveld en in datzelfde voorschrift staat dat in de periode van 1995 tot en met 2000 maximaal 317 kton gestort mag worden.

Uit de recente metingen van GEO blijkt dat er uitgaande van 14,5 m boven maaiveld nog een restcapaciteit is van 251 kton. Maar de hoeveelheid van 317

kton is allang bereikt!!! Er wordt jaarlijks ca 115 kton aangevoerd. Dus in 6 jaar zou dit ca 650 kton zijn. Dus de stortplaats zou onmiddellijk dicht moeten.

Ik denk dat vanuit vergunningverlening gezien niet de bedoeling kan zijn geweest. Ik heb 5.1.2e hiervan op de hoogte gebracht en dat ik eerst zal uitzoeken of deze hoeveelheid bewust is opgenomen in de vergunning of dat dit automatisch is overgenomen uit bijvoorbeeld de aanvraag. Als dit een ongelukje is zal ik met 5.1.2e overleggen hoe hiermee verder om te gaan.

Afhandelingsgegevens

- Brief

Ondertekening toezichthouder: 5.1.2e

Arnhem, 6 april 1999

Overleg met : 5.1.2e en 5.1.2e over laatste punt

(datum + handtekening)

Kopie:

- MW : archief
- MW/I/CPK

Kopie via mail:

- MW/IBM/HA : Senior TB

B E Z O E K R A P P O R T

BETREFT: Stort Doonweg

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Stort Doonweg B.V.
Adres : Kanaalweg 8a
Postcode : 6961LW
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e
Telefoon : 0313- 5.1.2e
Aard bedrijf : stortplaats

Naam inrichting : stort Doonweg
Adres : Doonweg
Plaats : Eerbeek

Datum laatste controle : 17 maart 1999
Controledatum : 19-1-2000 (overleg)
Aanvang controle : 9.00 uur
Einde controle : 12.30 uur

Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	toezichthouder	provincie Gelderland
	vergunningverlener	provincie Gelderland
	adviseur Doonweg	Arcadis
	directeur	Industriewater

Aanleiding overleg:

- Nieuwe geurvoorschriften
- Overschrijding stortcapaciteit
- Plannen m.b.t. afvalverwijdering na 1-1-2001
- monitoringsplan

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- WM-vergunning d.d. 22 februari 1996 MW-nr. 93.35874-6093034
- Provincie bevoegd gezag

Controlegegevens (algemeen)

1. Geurvoorschriften

Volgens de uitspraak van de Raad van State, d.d. 31 augustus 1999, zijn de geurvoorschriften van de Doonweg vernietigd. Naar aanleiding hiervan heeft Haskoning, in opdracht van de provincie, nieuwe geurvoorschriften opgesteld. Met omwonenden is afgesproken dat de nieuwe geurvoorschriften met hen besproken zullen worden, zodat het indienen van eventuele bedenkingen tegen de voorschriften voorkomen kan worden. Op verzoek van Doonweg zal 5.1.2e de laatste snuffelploegmetingen, die in oktober in een weekend zijn uitgevoerd, in de ontwerpbeschikking betrekken. 5.1.2e zal een exemplaar van de bevindingen van deze meting zo spoedig mogelijk toezenden (is gebeurd). Op 3 maart 2000 om 15.30 zal de ontwerpbeschikking in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de omwonenden besproken worden.

2. Stortcapaciteit

5.1.2e is van mening dat de hoogte van de stort als uitgangspunt genomen moet worden en dat het aantal tonnen van secundair belang is. Hij meldt verder dat de cijfers, uitgedrukt in tonnen, die jaarlijks naar de provincie gaan, feitelijk niet gebaseerd zijn op wegingen. Er wordt afgerekend op basis van aantal containers (volume) en voor de jaarlijkse opgave aan de provincie wordt deze hoeveelheid omgerekend naar tonnen. Volgens 5.1.2e zijn de kuubs in de loop der jaren lichter geworden doordat het afval meer ontwaterd wordt. Dus de hoeveelheid die volgens opgave aan de provincie op Doonweg gestort is, is mogelijk minder en ook de gevolgtrekking dat door verdubbeling van het aantal tonnen ook een verdubbeling van het aantal vrachtbewegingen plaatsvindt, is volgens 5.1.2e niet juist. Op de vraag of hierover gegevens bekend zijn, ofwel wordt regelmatig gewogen om de soortelijke massa van het afval opnieuw te bepalen, komt geen zelfverzekerd antwoord. 5.1.2e zegt dat hij dat bij alle toeleveranciers na zal moeten gaan. Hij vreest dat er niet veel is vastgelegd.

Geen van beiden weet het antwoord op de vraag of het Gelderse papierconvenant wel eens geëvalueerd wordt en hiervoor monitoringsgegevens beschikbaar zijn. 5.1.2e vertelt dat er toch al veel successen zijn geboekt ten aanzien van het convenant. Hij doelt hierbij op het ontwateren van het afval en de bouw van de CDEM-installatie die binnenkort start. Hij zegt dat in het convenant onvoldoende rekening is gehouden met stijging van de productie en eigenlijk de hoeveelheid afval per eenheid product als uitgangspunt genomen had moeten worden. Daarnaast is het gebruik van oud papier in het productieproces en de vraag naar betere papierkwaliteit toegenomen, waardoor er toch weer meer afval ontstaat.

Afgesproken is dat 5.1.2e probeert om het juiste tonnage van gestorte afvalstoffen in de afgelopen 5 jaren uitzoekt. Daarnaast zoekt hij ook uit hoeveel vrachten gemiddeld per dag wordt aangevoerd.

Aan de hand van deze gegevens zal bekeken worden hoe het met de restcapaciteit zit. Zeer waarschijnlijk zal er nog steeds meer gestort gaan worden dan is vergund. Dus een aanpassing van de vergunning is onvermijdelijk.

Aansluitend hierop vraagt 5.1.2e of de rejets van Parenco alvast gestort mogen worden. Hierop is van provinciezijde geen ja of nee gezegd. In ieder geval zullen eerst de werkelijke stortgegevens op tafel moeten komen. De reden dat Doonweg heel graag de rejets van Parenco wil ontvangen heeft enerzijds te maken met het feit dat Doonweg in de resterende tijd zoveel mogelijk afval wil ontvangen en anderzijds met de verhoging van het belastingtarief voor het storten van rejets. Storten op Doonweg is voor Parenco goedkoper dan storten in Wageningen.

Over het hoge storttarief voor de rejets heeft de gezamenlijke papierindustrie een brief aan minister Pronk gestuurd, waarin onder meer wordt gewezen naar het Gelderse papierconvenant (De papierindustrie neemt zelf haar verantwoordelijkheid voor het beëindigen van het storten voor brandbaar afval en krijgt hiertoe de ruimte tot 1 januari 2001). Eind deze maand vindt hierover overleg plaats met Pronk.

5.1.2e zegt dat het zuiveringsslib van Industriewater eveneens sinds 1-1-2000 onder het hoge belastingtarief valt. Ook dit zou in strijd zijn met de gemaakte afspraken, want er is nog geen alternatieve verwijderingsmogelijkheid. Dit betekent dat Industriewater 3 miljoen extra kosten heeft. Dit bedrag wordt niet doorberekend aan de leveranciers van het afvalwater, maar wordt betaald uit de reservering voor de eindafwerking!!!!

(Inmiddels heb ik begrepen dat voor het zuiveringsslib met ingang van 12 januari 2000 (+3 maanden overgangstermijn?) onder het Stortverbod valt. Dit betekent dat als geen ontheffing verleend kan worden, het storten in april 2000 al beëindigd zal moeten worden. Hierover zal ik nog telefonisch contact opnemen met 5.1.2e)

3. Plannen m.b.t. afvalverwerking na 1-1-2001

Als alles meezit is de CDEM-installatie 1-1-2001 klaar, maar 5.1.2e zegt dat het realistischer is om uit te gaan van eind 1e kwartaal 2001.

5.1.2e wil in ieder geval tot en met het eerste kwartaal door kunnen storten op de Doonweg.

Van provinciezijde is meegedeeld dat de einddatum voor het storten op de Doonweg een gegeven is en dat er voldoende stortcapaciteit elders is.

5.1.2e wil verlenging van de vergunning tot 1 april 2001 en is van mening dat bij de doelmatigheidsdiscussie de doelstellingen van het convenant als uitgangspunt genomen moeten worden (storten totdat CDEM gereed is). Als CDEM in gebruik is kunnen 2 van de drie Doonweg-stromen verwerkt worden. Voor de rejects zijn de plannen nog in ontwikkeling. Een oven die dit hoogcalorische afval kan verwerken is mogelijk pas over enkele jaren operationeel. Het is niet duidelijk wat Doonweg met deze stroom in de tussenliggende periode gaat doen. 5.1.2e is van mening dat alleen voor rejects de stort Doonweg niet open kan blijven, dus overweegt hij om een wijziging van de vergunningstermijn aan te vragen voor de periode tot 1 april 2001. Overigens laat hij dit achterwege als omwonenden hier absoluut geen medewerking aan willen verlenen, maar hij verwacht geen problemen.

4. Monitoringsplan

Het voorstel met betrekking tot locatie en diepte filters is accoord. De voorstellen die betrekking hebben op monitoringsfrequentie en het analysepakket zijn niet goed te keuren. Zonder onderbouwing wordt afgeweken van de vergunning. Afgesproken is dat in de GS-brief aangegeven zal worden dat alle metingen worden uitgevoerd zoals in de vergunning staat aangegeven. Indien daar aanleiding toe is en er voldoende meetgegevens zijn, kan Doonweg een gemotiveerd verzoek indienen om parameters achterwege te laten, dan wel minder vaak grondwaterstandsmetingen te verrichten.

Ondertekening toezichthouder: 5.1.2e

Arnhem, 6 april 1999

(datum + handtekening)

Kopie:

- MW : archief
- MW/I/CPK

Kopie via mail:

- MW/AV :
- MW/AV :
- MW/AV :
- MW/AV :
- MW/AV :
- Senior TB :

5.1.2e
