
Van [REDACTED]

Afgestemd met Begeleidingsgroep NDA, kernteam NDA

Aan Directeuren Overleg (DO) natuurdoelanalyses (NDA's)

C.c. -

Datum 15 maart 2022

Onderwerp Uitwerking pilotfase (NDA's)

Bijlage(n) Uitgewerkte planning pilotfase

Aanleiding en doel notitie

Aanleiding van deze notitie is om het directeurenoverleg natuurdoelanalyses (DO NDA's) te informeren over de aanpak en opzet van de pilotfase. Deze notitie gaat in op de volgende onderdelen:

- Wat is het doel van de pilotfase.
- Wat is het resultaat van de pilotfase.
- Op welke manier wordt de pilotfase vormgegeven (werkwijze).
- Welke partijen zijn betrokken en welke tijdlijn hoort hierbij.

Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met de provincies en besproken in de begeleidingsgroep NDA. Ook is de notitie toegelicht in de werkgroep Natura 2000.

Beslispunten DO:

1. Akkoord op de doelstellingen, het resultaat, de werkwijze en planning voor de pilotfase van de natuurdoelanalyses zoals opgenomen in voorliggende notitie;
 2. Kennisnemen van de inhoudelijk uitwerking van de pilotfase van de NDA's zoals opgenomen in de planning, welke als bijlage is toegevoegd aan deze notitie.
-

1. Doel pilotfase

In de routekaart natuurdoelanalyses (NDA's) staat het uitvoeren van pilotanalyses voor een aantal gebieden, doormiddel van een lerende ontwikkeling, genoemd als werkstap drie. De pilotfase heeft vier doelen:

1. Alle voortouwnemers (provincies, I&W en defensie) doen ervaring op met het proces van de NDA;
2. Tijdens de pilotfase kan gezamenlijk worden geleerd worden bepaald hoe om te gaan met de al bekende en verwachte knelpunten in het proces of inhoud; nieuwe knelpunten die naar boven komen tijdens de pilotfase kunnen gezamenlijk opgepakt worden;
3. De afspraken over hoe om te gaan met de bekende en nieuwe knelpunten worden vastgelegd in een handreiking, zodat die voor de overige gebieden direct inzetbaar is;

4. Naar aanleiding van deze stappen wordt de benodigde capaciteit en doorlooptijd van een natuurdoelanalyse gedetailleerder inzichtelijk. Dit is zowel voor de voortouwnemers zelf van belang als bij eventuele uitbesteding van opdrachten aan externe bureaus.

2. Resultaat

In de pilotfase voert elke voortouwnemer voor één gebied van de 'aandachtslijst' van de QuickScan een NDA uit. De provincies kiezen deze gebieden zelf op basis van de lijst met knelpunten, het kernteam van BIJ12/IPO zal coördineren dat alle knelpunten in de gebieden voldoende aan bod komen. Het resultaat van de pilotfase is driedelig:

1. Er is door elke voortouwnemer ervaring opgedaan met het opstellen van een NDA.
2. Er ontstaat een handreiking die als uniform document inzetbaar is voor het opstellen van de overige NDA's.
3. De handreiking is ook een format dat bruikbaar is wanneer een provincie (delen van) een NDA wil aanbesteden.
4. De pilots worden ter besluitvorming voorgelegd, zodat deze als basis voor de overige NDA's kunnen dienen. Hierbij is ook afstemming met de toekomstige ecologische autoriteit noodzakelijk, zodat borging ontstaat in het proces van beoordeling van de NDA's.

3. Werkwijze

Aan de start van de pilotfase is ondersteunend materiaal voor de pilot gereed, zie figuur 1. Het gaat hierbij om een vooraf opgestelde geannoteerde hoofdstukindeling voor een concept NDA, waarbij voor elke werkstap inzichtelijk wordt gemaakt welke tools en informatie beschikbaar is (pilotdocument). Er wordt in de pilots en eerste cycli van NDA's gewerkt met bestaande data en informatie. In het pilotdocument zijn ook knelpunten die al in beeld zijn en mogelijke "oplossingsrichtingen" voor deze knelpunten beschreven. Aan de hand van dit pilotdocument kan de voortouwnemer het proces van de NDA doorlopen. Per provincie wordt 1 pilotgebied geselecteerd, waarbij de 'aandachtslijst' van de QuickScan uitgangspunt is. Doordat de pilotgebieden zich verspreid over de 12 provincies bevinden zal automatisch een goede spreiding komen van habitattypen en mogelijke gebiedspecifieke knelpunten¹. Er wordt op de IPO-SharePoint een locatie ingericht waarbij alle voortouwnemers kunnen delen hoe ze omgaan met de vooraf genoemde en nieuw ontdekte knelpunten. Daarnaast is er wekelijks een afstemmoment in de bestaande inhoudelijke werkgroep NDA om de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen gezamenlijk door te spreken. Deze afstemmomenten worden door BIJ12 gecoördineerd en voorbereid.

Starten met 'no regret' werk aan alle overig NDA

De planning geeft weinig ruimte om de pilots uit te voeren en pas hierna te starten met NDA's voor de overige gebieden. Het is daarom van belang om, wat geleerd wordt in de pilotfase, snel toepasbaar te maken voor de overige gebieden en dus hiermee de handreiking aan te vullen. Door in de handreiking als eerste te starten met het identificeren van de 'no regrets' waarvan we weten dat deze inzetbaar zijn voor het uitvoeren van de NDA's, krijgt de handreiking snel een stevige inhoudelijke vulling. De knelpunten die geïdentificeerd worden proberen we binnen een korte cyclus op te lossen of te duiden. Wanneer dit niet mogelijk is benoemen we dit in de handreiking en bepalen we of het knelpunt voor een tweede cyclus NDA's als ontwikkelopgave meegenomen moet worden.


¹ Er zal in het proces ook ruimte zijn om een aantal pilotgebieden te selecteren op basis van onder druk staande vergunningverlening als deze gebieden naar boven zijn gekomen uit de QuickScan.

Datum 15 maart 2022
Onderwerp Keuze pilotgebieden natuurdoelanalyses (NDA's)

4. Betrokken partijen, organisatie en afstemmingslijnen

De eerdere genoemde handreiking NDA's wordt lerend opgesteld, samen met afgevaardigden van de provincies en andere voortouwnemers. Deze groep komt wekelijks onder voorzitterschap van IPO/BIJ12 bij elkaar om de voortgang, problemen en aandachtspunten van de pilot NDA's te bespreken en de handreiking hiermee aan te vullen. et aanvullen van de handreiking en ondersteuning bij vraagstukken waar tegenaan gelopen wordt (uitzoekwerk, data verzamelen, aanvullende analyses) wordt door BIJ12 gedaan.

Gedurende de pilotfase vindt maandelijks terugkoppeling plaats naar de AACVP werkgroep Natura 2000 en de begeleidingsgroep NDA, tussentijds kan indien relevant schriftelijk een update plaats vinden. Aanvullend wordt aantal bijpraatsessie georganiseerd voor de 'grotere' club waarin presentatie van problemen, oplossingsrichtingen en aandachtspunten plaatsvindt. Anhaking van de AAC-VP en het DO vindt plaats wanneer hier aanleiding voor is. De eindnotitie (zie planning) wordt aan de AAC-VP (ter informatie) en aan het DO toegezonden en ook in het DO besproken.

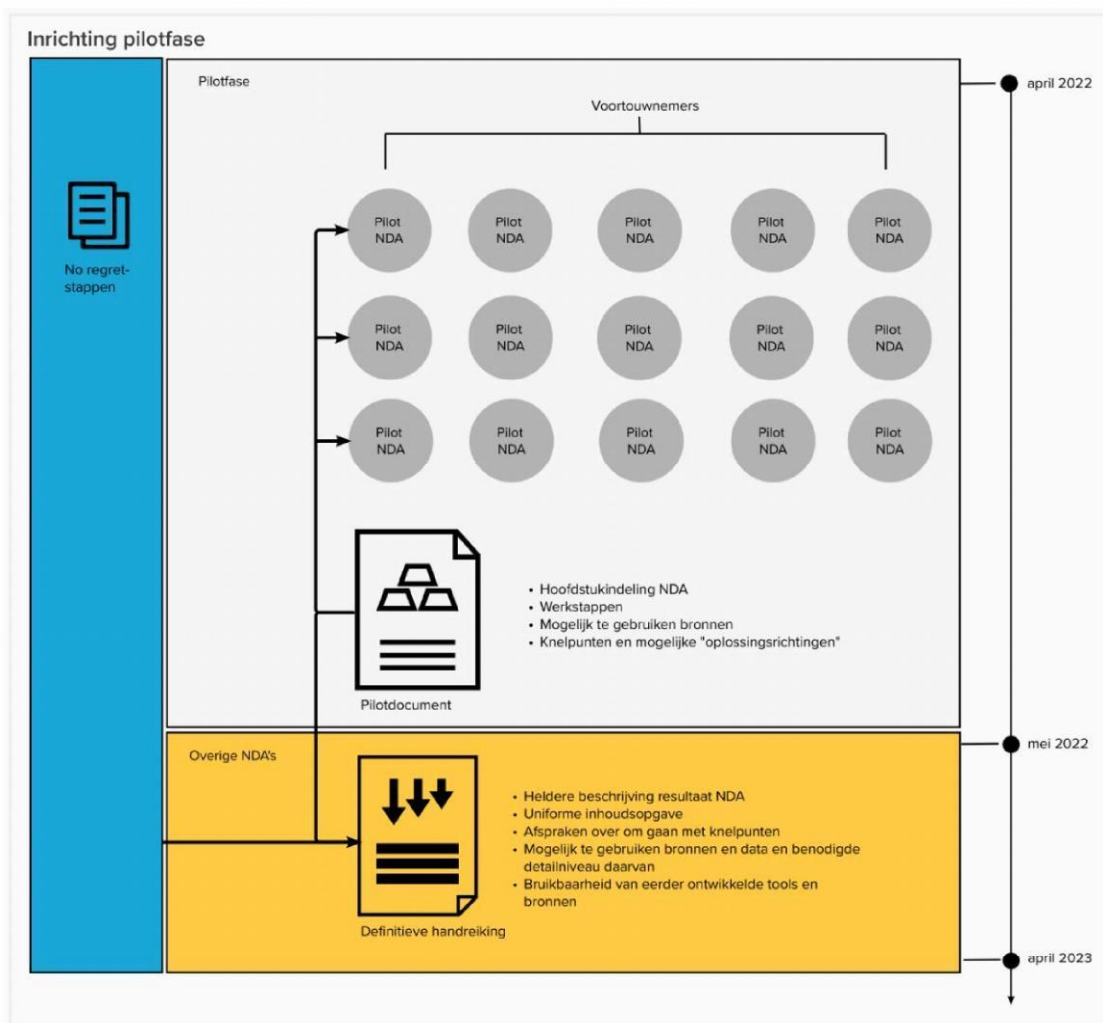

Figuur 1: Inrichting pilotfase

Datum 15 maart 2022
Onderwerp Keuze pilotgebieden natuurdoelanalyses (NDA's)

5. Werkstappen en procesplanning

1. Voorbereiden van materiaal om pilot te ondersteunen
 - eind maart afgerond
2. Selecteren van pilotgebied per provincie à na uitkomst QuickScan
 - eind maart
3. Instrueren van provincied medewerkers over proces
 - eind maart
4. Uitwerken NDA-pilotgebieden
 - april
5. Eerste versie handreiking maken voor overige NDA's. Hierin staan benodigde data-producten, te nemen stappen en te gebruiken producten kort beschreven
 - eind april
6. Verwerken leerpunten uit pilotfase in definitieve versie handreiking
 - half mei
7. Opstellen bijbehorende notitie met high-lights aandachtspunten en oplossingsrichtingen
 - tweede helft mei

De planning is nader uitgewerkt en als bijlage toegevoegd.

Datum 15 maart 2022
Onderwerp Keuze pilotgebieden natuurdoelanalyses (NDA's)

Bijlage:

Uitgewerkte planning pilotfase

Werkstap pilotfase	Onderwerp	Wie?	Deadline
1. Voorbereiden materiaal pilots	Geannoteerde hoofdstukindeling	Voorzet BIJ12, aanvulling voortouwnemers	Eind maart
	Werkstappen – inclusief 'no regrets'		
	Lijst met mogelijk te gebruiken tools		
	Knelpunten en mogelijke 'oplossingsrichtingen'		
2. Selecteren pilotgebied	Op basis van QuickScan	Voortouwnemers	Na 25 maart
3. Start pilotfase	Instructie over vooraf ontwikkelde materialen om de pilots uit te kunnen voeren.	BIJ12	Eind maart
4. Uitwerken pilotgebieden	Beoordelingskader	Voortouwnemers	Eind april
	Huidige Natuurkwaliteit		
	Omgevingscondities		
	Drukfactoren		
	Eventueel verdiepend onderzoek		
	Herstelmaatregelen		
	Conclusie en rapportage		
5. Eerste versie handreiking	Hoofdstukindeling	Meewerkgroep en BIJ12	Eind april
	Lijst met no regret-data om al te verzamelen		
	Overzicht van nu al uit te werken stappen voor alle NDA's		
	Afspraken over hoe om te gaan met knelpunten		
	Bruikbaarheid en inzetbaarheid van eerdere initiatieven		
	Voorbeeld van uitvraag voor externe partij		
6. Verwerken leerpunten pilotfase in definitieve versie handreiking	Inzichten uit pilots verwerkt	BIJ12 met input provincies	Half mei
7. Opstellen notitie	Vastleggen van aandachtspunten, oplossingsrichtingen en proces NDA's		Tweede helft mei
