Fiche Verkenning gebiedsproces Watersysteem Lochemse Berg e.o. - Waterschap Rijn en IJssel

<table>
<tr><th>Doel(en)</th><th>Beoogde resultaten
(=voorgenomen prestaties)</th><th>Beoogde maatschappelijke effecten</th></tr>
<tr>
<td>Verkenningsfase

Thematische gebiedsuitwerking voor een robuust klimaatbestendig watersysteem dat in de toekomst voor voldoende (kwantiteit) en schoon (drink)water (kwaliteit) zorgt.</td>
<td>De onderstaande beoogde resultaten staan beschreven in paragraaf 5.1 van de Eindrapportage Pre-verkenning Watersysteem Lochemse Berg e.o.. (bijlage 1).

De verkenningsfase loopt tot en met 2028 waarin de volgende vijf stappen worden uitgewerkt:
1. Opstellen van een projectplan en een hydrologisch perspectief
2. Voorbereiding en start met drie kleinschalige gebiedstrajecten met stakeholders
3. Uitvoering geen spijt maatregelen in de drie kleinschalige gebiedstrajecten
4. Opstellen uitvoeringsprogramma: planuitwerking met structurele maatregelen (deelgebieden en totale gebied), financiering, capaciteit
5. Opstellen samenwerkingsovereenkomst

<table>
<tr><th></th><th colspan="4">2026</th><th colspan="4">2027</th><th colspan="4">2028</th></tr>
<tr><th></th><th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th><th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th><th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th></tr>
<tr><td>Stap 1 projectplan + hydrologisch perspectief</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Stap 2 ,3 kleinschalig gebiedstraject + uitvoering geen spijtmaatregelen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Stap 4, 5 Uitvoeringsprogramma en SOK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>Vitens, Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Lochem, vereniging contact barchemen Provincie Gelderland hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk tot een aanpak te komen die leidt tot een meer klimaatbestendig watersysteem op en rond de Lochemse Berg. Daarbij hoort een duurzame drinkwaterwinning met toekomstbestendige landbouw en een hoge(re) landschappelijke kwaliteit. Dit is vertaald in het project Watersysteem Lochemse Berg e.o..

De hoofdopgave voor het project is het werken aan een robuust watersysteem met op de lange termijn voldoende en schoon (drink)water. Dat betekent een belangrijke opgave om meer water vast te houden in het kader van de Aanpak Droogte Achterhoek en waterkwaliteitsopgave vanuit de KRW grondwaterdoelen. Op basis van de Drinkwaterwet dragen overheden zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening (waterkwantiteitsopgave). Daarnaast zijn er meekoppelkansen voor natuur en landbouw.</td>
</tr>
</table>

Toelichting	Middeleninzet

Financiën voor 3 jaar 2026 -2028
In paragraaf 5.3 van de Eindrapportage pre-verkenning Watersysteem Lochemse Berg e.o. worden de benodigde middelen en het dekkingsvoorstel beschreven.


Activiteiten	Capaciteit	Totale looptijd (3 jaar)	
		Capaciteit	Kosten (€)[1]
Projectleider extern	2026: 0,6 fte 2027: 0,6 fte 2028: 0,3 fte	2400 uur	€335.000[2]
Vitens (coördinatie en interne afstemming; inhoudelijke inbreng; gebiedskennis; hydrologische kennis)	0,3 fte		
Waterschap (coördinatie en interne afstemming; inhoudelijke inbreng; gebiedskennis; hydrologische kennis) Waterschap (ondersteuning projectleider)	0,3 fte 0,1 fte		
Provincie (afstemming provincie intern; inhoudelijke inbreng)	0,3 fte		
Hydrologisch perspectief			€ 100.000
Onvoorzien	-	-	€ 65.000
Totaal[4]			€ 500.000[4]
Uitvoering geen-spijtmaatregelen[3]			*€ 120.000*[3]
	-	-	

[1] *Kostenraming o.b.v. uurtarief van €140 en 40 werkweken in het jaar.*
[2] *Betreft richtbedrag dat afhankelijk van contractvorm*
[3] *Dit wordt gefinancierd uit het EDDGI-budget bij het waterschap (EDDGI: Elke Druppel De Grond In)*
[4] *Dit wordt gefinancierd door de provincie via de SPUK maatregelenpakket gebiedsprocessen 2024*

TOTALE KOSTEN verkenning Waarvan: - proces - onderzoek - realisatie	**€620.000** €335.000 €165.000 €120.000	
Provincie Waterschap	€500.000 €120.000	

Rol partijen en werkwijze
In paragraaf 5.2 in de Eindrapportage pre-verkenning Watersysteem Lochemse Berg staat de governance beschreven en is opgenomen in de intentieovereenkomst (bijlage 2). Afspraken in deze intentieovereenkomst zijn leidend voor dit gebiedsproces.
Hoewel Provincie Gelderland, Vitens gemeente Lochem , VCB en Waterschap Rijn en IJssel graag vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid willen werken aan de opgaven is afgesproken dat het waterschap voor dit gebiedsproces de trekker en opdrachtgever is op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Het waterschap is daarmee de opdrachtgever van de (niet aan partijen gelieerde) projectleider die het projectteam vanuit de deelnemende organisaties leidt en aanstuurt. De gemeente Lochem is een belangrijk adviseur in relatie tot ontwikkelingen in het gebied en heeft een onafhankelijke rol als vergunningverlener

Figuur 1. Watersysteem Lochemse Berg e.o.

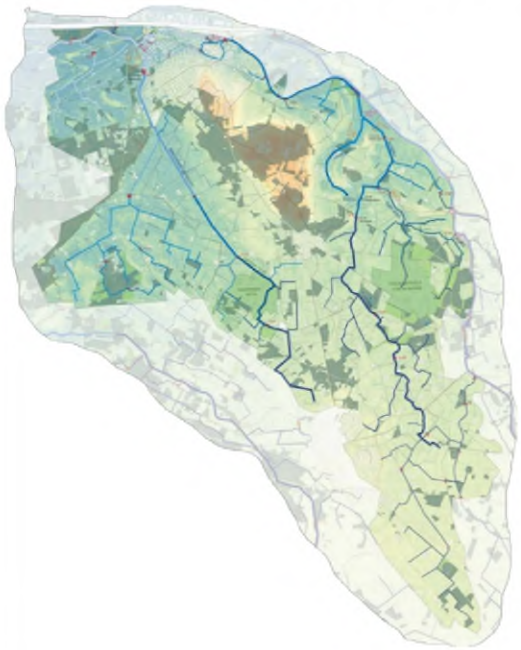

Figuur 2. Drie focusgebieden

