
Landgoederen Brummen

Startnotitie projectbeschrijving en participatie aanpak




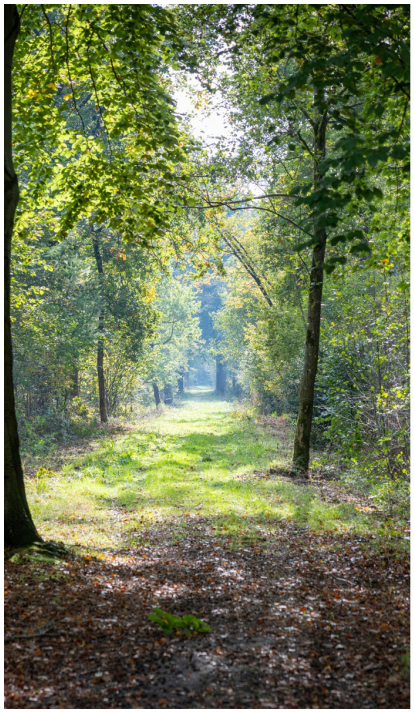

provincie Gelderland

Inhoud

1	**Waarom werken we aan Landgoederen Brummen?**	**4**
1.1	De opgave	4
1.2	Wat gaan we doen?	4
1.3	Werken aan afgebakende projecten	5
2	**Hoe betrekken we de omgeving?**	**6**
2.1	Waarom betrekken we bewoners en belanghebbenden?	6
2.2	Wat staat vast en waarover kunt u meedenken?	6
2.3	Vrijwilligheid en besluitvorming	7
3	**Wie betrekken we?**	**9**
4	**Wanneer wordt u betrokken?**	**10**
5	**Wat doen we met uw inbreng?**	**11**
6	**Participatieniveau per doelgroep**	**12**
7	**Communicatie**	**13**
7.1	Kernboodschap	13
7.2	Hoe houden wij u op de hoogte?	13
8	**Actuele planning per project**	**14**

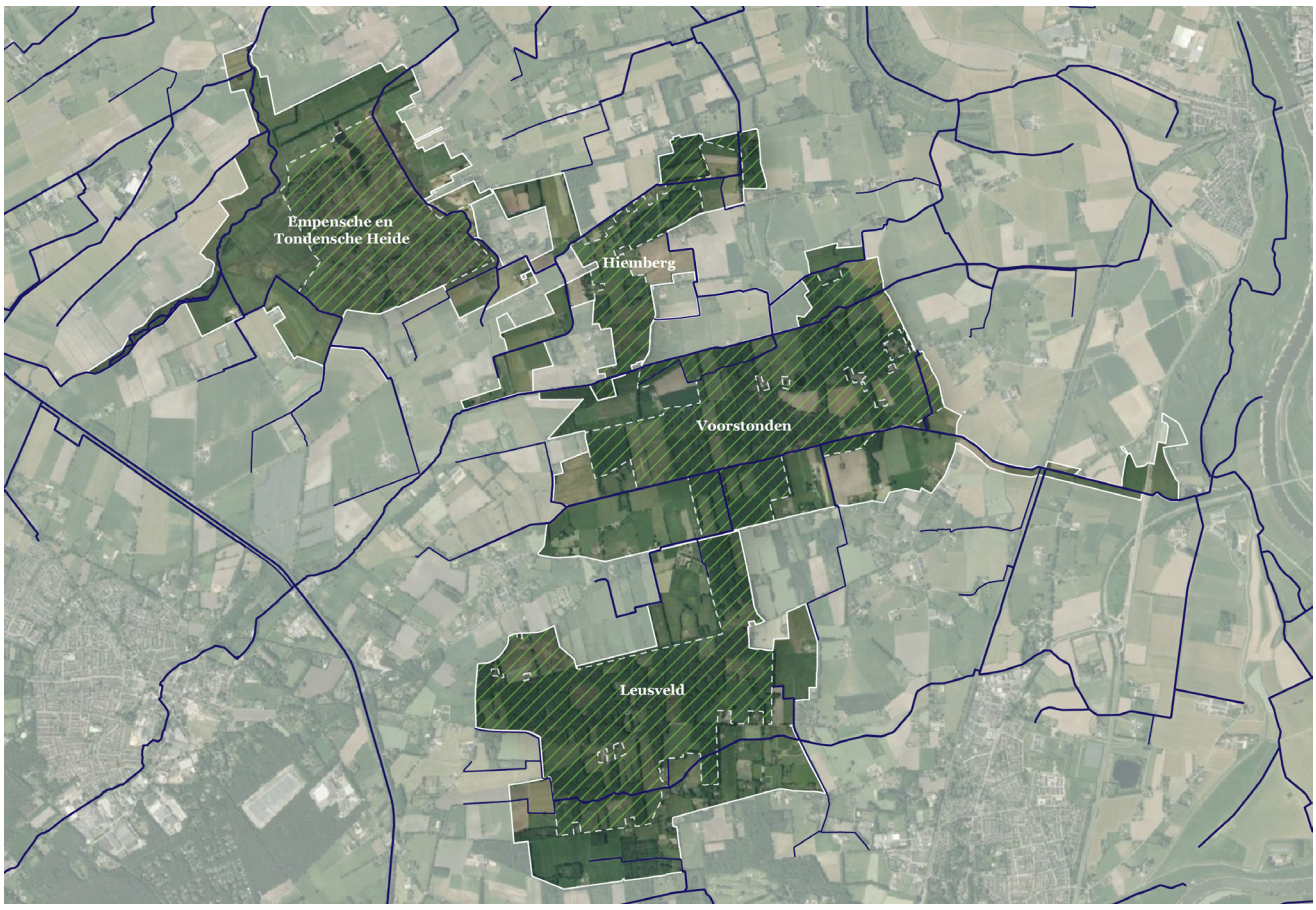

1 Waarom werken we aan Landgoederen Brummen?

1.1 De opgave

Landgoederen Brummen is een Natura 2000-gebied met bijzondere natuurwaarden. Het gebied bestaat uit de deelgebieden Empese en Tondense Heide, Voorstonden, Leusveld en Hiemberg. De natuur in deze gebieden is afhankelijk van een goed functionerend watersysteem en van de aanwezigheid van grondwater met de juiste samenstelling.

De afgelopen decennia is het gebied verdroogd. Daardoor staan verschillende beschermde natuurtypen onder druk. Om deze natuur te behouden en te herstellen zijn maatregelen nodig. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan Landgoederen Brummen.

Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beheerplan. Daarbij werken wij samen met grondeigenaren, terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen en andere betrokken partijen. Het waterschap is betrokken voordat keuzes worden gemaakt, en kijkt naar het waterbelang in relaties tot alle functies, geeft daarover advies en is daarnaast vergunningverlener voor de water gerelateerde maatregelen. Provincie voert sommige delen van het project zelf uit en is voor andere delen de opdrachtgever, waarbij bijvoorbeeld het waterschap of Natuurmonumenten uitvoerders kunnen zijn.

1.2 Wat gaan we doen?

Om de natuurdoelen te realiseren voeren we verschillende projecten uit. Daarbij richten we ons vooral op het herstel van het watersysteem en het verminderen van de verdroging. We starten met drie prioritaire projecten:

Oekense Beek
Bij de Oekense Beek onderzoeken we maatregelen om het watersysteem te herstellen en de natuur beter te beschermen tegen verdroging.



Oekense Beek die droog staat



Oude Haarsloot, en de rabatten aan de linkerzijde

Rhienderense Beek
Bij de Rhienderense Beek werken we aan maatregelen die bijdragen aan herstel van het beekdal, verbetering van de waterhuishouding en versterking van de natuur.

Haarsloot
Bij de Haarsloot onderzoeken we maatregelen om water langer vast te houden en de natuurlijke waterhuishouding te verbeteren.

Naast deze prioritaire projecten lopen binnen Landgoederen Brummen al verschillende andere natuurherstelprojecten. Tijdens de uitvoering kunnen daar nieuwe projecten bij komen. Dat gebeurt alleen als deze nodig zijn om de Natura 2000 doelen te bereiken en passen binnen het beheerplan.

Ook kunnen tijdens de uitvoering nieuwe projecten worden toegevoegd wanneer deze aangetoond bijdragen aan de natuurdoelen of het herstel van het watersysteem.

Deze drie projecten krijgen voorrang omdat ze naar verwachting veel bijdragen aan herstel van het watersysteem en de natuur, en omdat er mogelijkheden zijn om ze daadwerkelijk uit te voeren. Deze mogelijkheden zijn we nog aan het verkennen, en hier betrekken we de omgeving bij.

1.3 Werken aan afgebakende projecten

Provincie Gelderland voert de uitvoering van het Natura 2000-beheerplan nu uit via afgebakende projecten in deelgebieden. Hierdoor kunnen maatregelen stap voor stap worden voorbereid en uitgevoerd, met gerichte betrokkenheid van bewoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden. Meer hierover leest u in hoofdstuk 2.

Bij de voorbereiding van de projecten gebruiken we relevante onderzoeken, gebiedskennis en ervaringen uit eerdere trajecten. Ook eerdere inbreng van bewoners en andere betrokkenen nemen we mee waar die nog relevant is.



Luchtfoto Voorstonden Leusveld, met natuurvriendelijk beheer van Natuurmonumenten

2 Hoe betrekken we de omgeving?

2.1 Waarom betrekken we bewoners en belanghebbenden?

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van projecten maken we graag gebruik van kennis, ervaring en inzichten uit het gebied. Mensen die er wonen, werken of grond bezitten kennen hun omgeving goed en kunnen belangrijke informatie aandragen.

Door de omgeving vroegtijdig te betrekken kunnen we:

- zorgen voor een transparant en navolgbaar proces;
- lokale kennis benutten;
- kansen en aandachtspunten vroegtijdig signaleren;
- plannen beter laten aansluiten op de omgeving;
- bouwen aan vertrouwen.

2.2 Wat staat vast en waarover kunt u meedenken?

In het Natura 2000 beheerplan staan de natuurdoelen en de maatregelen die nodig zijn om die doelen te bereiken. Deze vormen het uitgangspunt voor onze projecten. Niet alle maatregelen worden tegelijk uitgevoerd. We werken stap voor stap en geven prioriteit aan de maatregelen die op dit moment het meest bijdragen aan herstel van het watersysteem en uitvoerbaar zijn.

Over de manier waarop deze maatregelen worden uitgevoerd en ingepast is vaak nog ruimte voor keuzes. Bij de voorbereiding onderzoeken we daarom verschillende mogelijkheden. Hierover kunnen Direct Betrokkenen meedenken en hun voorkeur uitspreken. Daarbij horen we graag welke kansen, ideeën, aandachtspunten en zorgen er leven. Hierbij kijken we graag naar mogelijkheden om elkaars belangen te versterken. Die kennis nemen we mee bij de verdere uitwerking van de plannen..

Na de keuze voor een voorkeursrichting wordt de ruimte voor veranderingen kleiner. Op dat moment gaat het gesprek vooral over de verdere uitwerking, de inpassing in de omgeving en ideeën daarover van Directe en Indirecte Betrokkenen, en het voorkomen of beperken van ongewenste effecten.



Foto Koekoeksbloem

2.3 Vrijwilligheid en besluitvorming

Bij de uitvoering van projecten zoeken we eerst samen met betrokkenen naar oplossingen die op vrijwillige basis kunnen worden gerealiseerd.

Wij vinden het belangrijk om in gesprek te blijven en waar mogelijk rekening te houden met lokale belangen en omstandigheden. Daarbij kunnen plannen worden aangepast om gevolgen voor de omgeving te voorkomen of te beperken en kijken we ook naar mogelijke gevolgen voor woningen, bedrijven en het gebruik van grond.


Tegelijkertijd zijn wij verantwoordelijk voor het behalen van de Natura 2000-doelen. Wanneer een maatregel noodzakelijk blijkt voor het behalen van deze doelen en vrijwillige oplossingen niet mogelijk zijn, kan het provinciebestuur besluiten om een maatregel alsnog verder in procedure te brengen. Dat vraagt altijd om een afzonderlijke bestuurlijke afweging en een zorgvuldige procedure.



Empese en Tondense Heide

Besluitvorming - Landgoederen Brummen

Stap voor stap naar uitvoering van het beheerplan

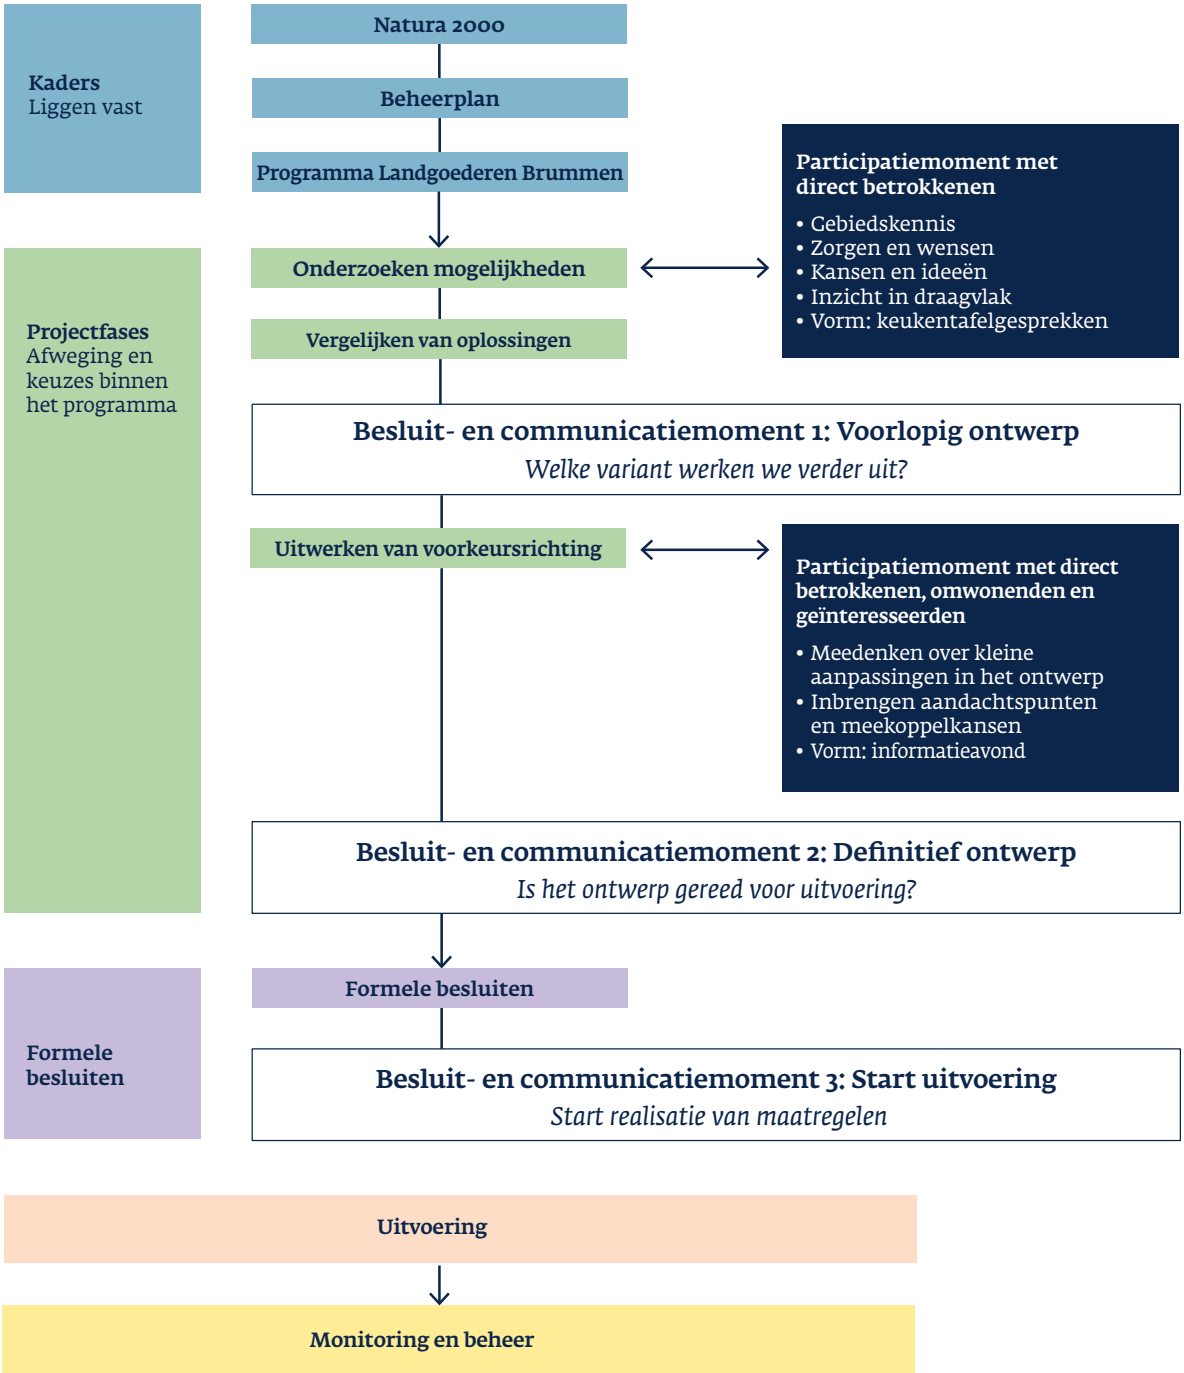

Wie kan inbreng leveren?

Direct betrokkenen: grondeigenaren worden persoonlijk benaderd. Wij raadplegen hen over de te nemen maatregelen en opties. Zij kunnen hun ideeën aan ons voorleggen.

Omwonenden en geïnteresseerden: Mensen die niet in het deelgebied wonen of eigendommen hebben kunnen hun inbreng leveren op een informatieavond. Zij worden hierover tijdig geïnformeerd via de nieuwsbrief en de pers, en kunnen terecht op de website.

Belangenbehartigers met specifieke gebiedskennis nodigen we uit om hun kennis bij ons in te brengen. Dit kan tot besluitmoment 2.

Alle aanpassingen aan het ontwerp waarmee we nog steeds de doelen kunnen halen kunnen worden ingebracht.

3 Wie betrekken we?

Per project bekijken we wie direct gevolgen van een maatregel kan ondervinden. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar mogelijke veranderingen in grondwater, grondgebruik en de gevolgen daarvan voor woningen, percelen en bedrijven.

Eigenaren en pachters, en direct omwonenden
Eigenaren en pachters van gronden, en alle omwonenden die gevolgen van een maatregel ondervinden worden persoonlijk benaderd.
Met hen voeren we gesprekken over mogelijke maatregelen, de gevolgen daarvan en verschillende oplossingsrichtingen die worden onderzocht.

Omwonenden en geïnteresseerden
Omwonenden en andere geïnteresseerden houden we op de hoogte via de website, nieuwsbrieven en waar nodig informatiebijeenkomsten.

Belangenvertegenwoordigers en kennispartners
Organisaties, bewonersgroepen en andere betrokkenen met specifieke gebiedskennis kunnen waardevolle inzichten leveren. Waar relevant gaan we hiermee in gesprek.

Samenwerkingspartners
De provincie werkt samen met onder andere:
- Waterschap Vallei en Veluwe;
- Gemeente Brummen;
- Landgoederen;
- Terrein beherende organisaties;
- Particuliere grondeigenaren en pachters

Wie welke rol heeft, verschilt per project. De ene partij denkt mee of adviseert, terwijl een andere partij zelf maatregelen uitvoert op eigen terrein.



Slenk die zorgt voor een natuurlijke waterafvoer bij Voorstonden en Leusveld



Empese en Tondense Heide

4 Wanneer wordt u betrokken?

Per project doorlopen we een aantal stappen. In iedere fase bekijken we welke betrokkenheid nodig is (zie ook het schema “Besluitvorming” op p.4). Bij projecten waarbij verschillende oplossingen mogelijk zijn, doorlopen we in hoofdlijnen de volgende stappen:

Stap 1 – Onderzoeken van mogelijkheden
Eerst verzamelen we informatie en onderzoeken we welke oplossingen mogelijk zijn.

In deze fase halen we kennis en aandachtspunten op uit het gebied. Ook gaan we in gesprek met direct betrokkenen.

Stap 2 – Vergelijken van oplossingen
Vervolgens vergelijken we verschillende mogelijkheden. We kijken daarbij onder andere naar:

- bijdrage aan de natuurdoelen;
- effecten op het watersysteem;
- uitvoerbaarheid;
- gevolgen voor de omgeving;
- kosten.

Als we verschillende oplossingen vergelijken, gebruiken we een afwegingskader. Daarin nemen we ook de inbreng uit de omgeving mee (zie figuur).

Tijdens de keukentafelgesprekken hebben we een concreter beeld bij welke oplossingen we willen vergelijken. Hierbij besteden we specifiek aandacht aan de mogelijke gevolgen voor woningen, grondgebruik en bedrijfsvoering.

Stap 3 – Uitwerken van een voorkeursrichting
Op basis van de onderzoeken kiezen we een voorkeursrichting.

Deze werken we verder uit tot een ontwerp. Hierbij blijven we in gesprek met direct betrokkenen en informeren we de omgeving over de voortgang.


Stap 4 – Uitvoering
Wanneer alle voorbereidingen zijn afgerond voeren we de maatregelen uit.

Omwonenden en andere betrokkenen worden vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden en de planning.

Stap 5 – Monitoring en beheer
Na uitvoering kijken we of de maatregel werkt zoals bedoeld. De resultaten gebruiken we om te beoordelen of bijsturing nodig is.

Samenhang beoordelingscriteria en belangen

wat is van invloed op onze keuzes

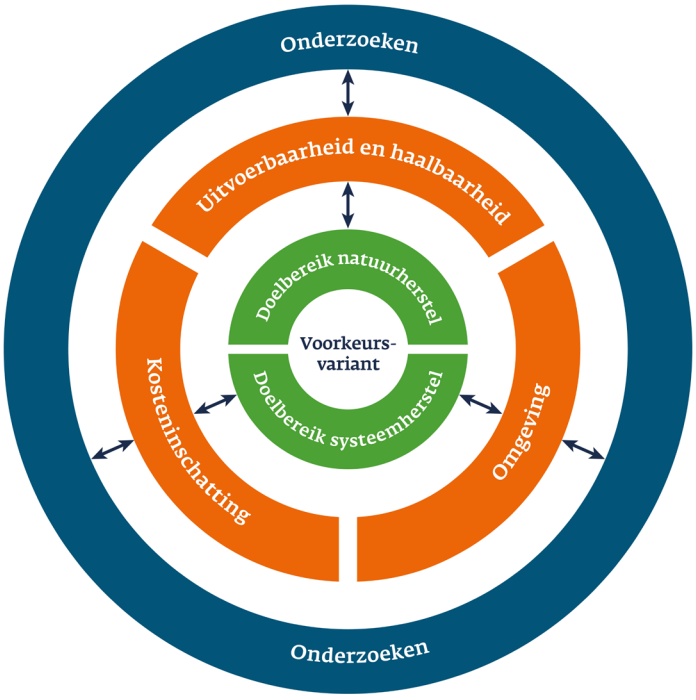

5 Wat doen we met uw inbreng?

Wij vinden het belangrijk dat duidelijk is wat er met reacties gebeurt. Daarom:

- leggen we reacties, ideeën en aandachtspunten vast in een zogeheten ‘klant eisen systeem’;
- nemen we deze mee in de afweging;
- beoordelen we de uitvoerbaarheid;
- kijken we naar gevolgen voor natuur, omgeving en kosten;
- koppelen we per individu terug wat met de reacties is gedaan.

Terugkoppeling van het eerste participatiemoment zal plaatsvinden wanneer alle keukentafel-gesprekken met Direct Betrokkenen zijn gevoerd. Het terugkoppelen van het tweede participatiemoment, van de inbreng van Indirect en Direct Betrokkenen zal na afloop van, bijvoorbeeld, een inloopavond gebeuren. Meld je aan voor de nieuwsbrief en houdt de website in de gaten voor actuele data.

Niet alle voorstellen kunnen worden overgenomen. Soms zijn er wettelijke, technische, ecologische of financiële redenen waarom dat niet mogelijk is. Wanneer dat het geval is leggen wij uit waarom een voorstel wel of niet wordt meegenomen.

Zo zorgen we voor een transparant en navolgbaar proces.



Voorstonden Leusveld

6 Participatieniveau per doelgroep

Binnen Landgoederen Brummen passen wij de Gelderse participatieaanpak toe.

De mate van betrokkenheid verschilt per doelgroep.

Doelgroep	Participatieniveau
Omwonenden en geïnteresseerden	Informeren
Eigenaren, pachters en direct omwonenden die gevolgen van een maatregel ondervinden	Raadplegen en adviseren
Belangenvertegenwoordigers en kennispartners	Raadplegen en adviseren
Samenwerkingspartners	Samenwerken

Per project bekijken we wie direct gevolgen kan ondervinden. Deze mensen betrekken we actief bij de voorbereiding. De bredere omgeving houden we op de hoogte van de voortgang en belangrijke momenten. De mate van belang wordt in die zin gekoppeld aan de mate van invloed: dit houdt in dat de mate waarin een betrokkene gevolgen kan ondervinden, bepaalt ook de mate van meedenken en werken aan het ontwerp.



Empese en Tondense Heide

7 Communicatie

7.1 Kernboodschap

Provincie Gelderland werkt aan het herstel van de natuur in Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen. Om deze bijzondere natuur ook voor toekomstige generaties te behouden, voeren wij maatregelen uit die bijdragen aan herstel van het watersysteem en het verminderen van verdroging.

De natuurdoelen en de maatregelen uit het Natura 2000 beheerplan zijn het uitgangspunt. Per project worden mogelijke oplossingen onderzocht en uitgewerkt. Daarbij betrekken we de mensen die direct gevolgen van een maatregel kunnen ondervinden. Hun kennis, aandachtspunten en belangen worden meegenomen in de afweging.

7.2 Hoe houden wij u op de hoogte?

We gebruiken verschillende communicatiemiddelen.

Website
Op de website van de provincie Gelderland publiceren wij actuele informatie over de projecten in Landgoederen Brummen.

Nieuwsbrief
Via de nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over de voortgang van projecten, belangrijke besluiten en toekomstige participatiemomenten.

Persoonlijke gesprekken
Wanneer maatregelen direct gevolgen voor iemand kunnen hebben, gaan we persoonlijk met diegene in gesprek.

Informatiebijeenkomsten
Bij grotere projecten kunnen informatie- of inloop-bijeenkomsten worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten geven wij uitleg over de plannen en is er ruimte voor vragen, aandachtspunten en suggesties. Wanneer deze worden georganiseerd zal via de nieuwsbrief en website worden gecommuniceerd.



Voorstonden Leusveld

8 Actuele planning per project

De planning verschilt per project en kan gedurende het proces veranderen. Actuele informatie over de planning en belangrijke momenten delen we via de website.

Daarbij geven we aan waar een project staat, wat de volgende stap is en wanneer betrokkenen kunnen meedenken. Hier ziet u:

- in welke fase een project zich bevindt;
- welke onderzoeken worden uitgevoerd;
- wanneer participatiemomenten plaatsvinden;
- welke besluiten eraan komen;
- wanneer uitvoering wordt verwacht.

Zo kunt u volgen wat er gebeurt en wanneer u kunt meedenken.



Koolwitje in Voorstonden Leusveld



Empese en Tondense Heide

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG Arnhem
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl

26 800 218
